

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARANI

DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS



INFORME ANUAL

2017



GESTION
SRA. DUNIA ROJAS MAMANI

PROYECTOS OBRAS PUBLICAS

A.P.	Descripción	Presupuesto	Ejecutado	% Ejecución	Saldo
11 0000 002	ADQUISICION DE TUBERIA PARA RIEGO JANCHILLANI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11 0012 000	CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS DISTRITOS 4 Y5	1,239,479.54	0.00	0.00	1,239,479.54
12 0001 000	CONST. CANAL DE RIEGO VILLA CARMEN ARANI	90,000.00	87,200.00	96.89	2,800.00
12 0003 000	CONST. SONDEO ELÉCTRICO PERFORACIÓN DE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
12 0006 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO SERRANO ALTO (ETP)	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00
12 0008 000	CONST. OBRA DE TOMA PARA RIEGO CATACHILLA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
12 0010 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO CONVENTO PAMPA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
12 0011 000	CONST. PERFORACIÓN DE POZO RIEGO ARACHACA	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00
12 0012 000	CONST. PERFORACIÓN DE POZO DE RIEGO (ZONA MOLLE MOLLE Y LAGUNITA	40,000.00	39,999.96	100.00	0.04
16 0000 001	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y FUBNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AREA URBANA - RURAL	200,000.00	115,427.53	57.71	84,572.47
16 0000 002	AMPLIACION DE LINEA PILOTO LINDE GRANDE - LINDE CHICO	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00
16 0000 003	AMPLIACION DE LINEA PILOTO PHUYU PHUYU	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00
17 0001 000	CONST. CORDONES CHINGURI	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

PROYECTOS OBRAS PUBLICAS

A.P.	Descripción	Presupuesto	Ejecutado	% Ejecución	Saldo
17 0002 000	CONST. CORDONES POCOATA BAJA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
17 0003 000	CONST. EMPEDRADO CONVENTO PAMPA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
17 0004 000	CONST. MERCADO CENTRAL ARANI "	2,538,191.72	2,537,560.45	99.98	631.27
17 0005 000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE ABAROA	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00
17 0007 000	CONST. CONSTRUCCION TINGLADO SUB CENTRAL	29,635.00	19,998.00	67.48	9,637.00
18 0000 001	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS VECINALES	260,000.00	243,707.36	93.73	16,292.64
18 0001 000	CONST. PUENTES VEHICULARES MENORES D-4	50,000.00	49,088.00	98.18	912.00
18 0002 000	CONST. PUENTES MENORES POCOATA CENTRO	40,000.00	40,000.00	100.00	0.00
18 0003 000	APERT. CAMINOS PILA PATA – CERCO PAMPA	40,000.00	39,950.00	99.88	50.00
18 0005 000	CONST. PUENTE VEHICULAR RIO POCOATA Â PUKA ORKO	4,004,661.35	0.00	0.00	4,004,661.35
20 0000 014	MANTENIMIENTO Y REFACCION POSTAS Y CENTRO	300,000.00	199,222.50	66.41	100,777.50
20 0001 000	CONST. PUESTO DE SALUD SAGA SAGA	469,711.43	0.00	0.00	469,711.43
20 0002 000	CONST. PUESTO DE SALUD LINDE CHICO Y LINDE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

PROYECTOS OBRAS PUBLICAS

A.P.	Descripción	Presupuesto	Ejecutado	% Ejecución	Saldo
21 0000 005	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES	150,000.00	149,986.82	99.99	13.18
21 0002 000	CONST. MURO PERIMETRAL U.E. EDUARDO	40,000.00	39,976.21	99.94	23.79
21 0003 000	CONST. AULAS UNIDAD EDUCATIVA ARANI "	1,663,500.59	1,663,500.57	100.00	0.02
21 0006 000	CONST. TINGLADO U.E. JUZGADO	276,724.50	275,568.48	99.58	1,156.02
21 0010 000	CONST. ENMALLADO U.E. COLLPA BAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
21 0011 000	CONST. AULAS UNIDAD EDUCATIVA PUKA WASI	42,747.86	42,647.29	99.76	100.57
21 0012 000	CONST. AULAS UNIDAD EDUCATIVA SERRANO	557,077.18	556,789.82	99.95	287.36
22 0001 000	CONST. CANCHA MÚLTIPLE VILLA BARRIENTOS	27,000.00	25,819.00	95.63	1,181.00
22 0002 000	CONST. CAMPO DEPORTIVO POCOATA ALTA (E.T.D.P)	40,000.00	30,000.00	75.00	10,000.00
22 0003 000	CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO TAMBILLO	1,495,124.93	1,482,312.29	99.14	12,812.64
22 0004 000	CONST. ENMALLADO CANCHA DE FUTBOL	105,100.00	0.00	0.00	105,100.00
22 0005 000	CONST. CANCHA POLI FUNCION EN LA COMUNIDAD DE VILLA EVITA	95,000.00	95,000.00	100.00	0.00
31 0000 001	MANTENIMIENTO, DRAGADO Y CUIDADO DE	10,000.00	9,850.00	98.50	150.00
34 0000 005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	90,000.00	89,892.23	99.88	107.77

PROYECTO:
ADQUISICION DE TUBERIA PARA RIEGO JANCHILLANI

APERTURA
11 0000 002

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00%	0%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE CONSENSO Y TOMA DE DECISIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

PROYECTO:
CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS DISTRITOS 4 Y
5 ARANI

APERTURA
11 0012 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
1,239,479.54	0.00	1,239,479.54	70.00%	0%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR PROBLEMAS SOCIALES DE EMPLAZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL CUAL FUE INSPECCIONADO Y VERIFICADO POR EL CONTROL SOCIAL DEL MUNICIPIO.



PROYECTO:
CONST. CANAL DE RIEGO VILLA CARMEN ARANI (ETP) D-1

APERTURA
12 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
90,000.00	87,200.00	2,800.00	100.00%	96.86%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO FUE EJECUTADO DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD, QUE COMPRENDE 6 TRAMOS Y UNA LONGITUD DE CANALIZACION DE 9.958 ML, EN UN PLAZO DE 45 DIAS CALENDARIOS.




PROYECTO:
CONST. SONDEO ELÉCTRICO PERFORACIÓN DE POZO DISTRITO 2

APERTURA
12 0003 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
24,000.00	0.00	24,000.00	100.00%	0%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA ELABORACION DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES EN LAS COMUNIDADES JUTULAYA, CINTHA JHOCHI, LAGUNA, KUMO KEWIÑA, SERRANO, VILLA CARIÑO, VILLA SURUMI. EN COORDINACION Y CONFORMIDAD CON LOS BENEFICIARIOS.

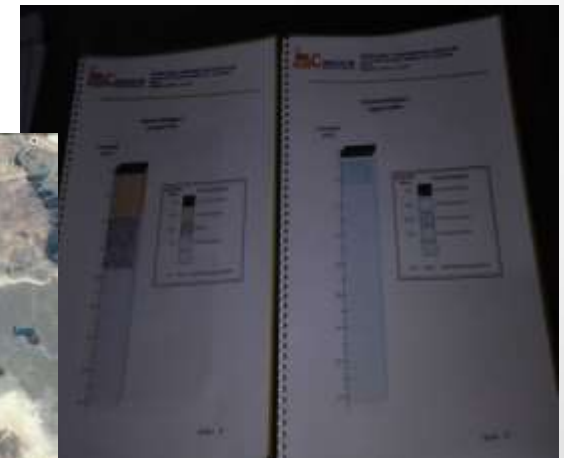

**PROYECTO:
CONST. SISTEMA DE RIEGO SERRANO ALTO (ETP)**

APERTURA
12 0006 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
15,000.00	15,000.00	0.00	100.00%	100%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO SERRANO ALTO EL CUAL CONTEMPLA OBRA DE TOMA TIPO (EMBALSE), RED DE DISTRIBUCION E HIDRANTES DE RIEGO. EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS.



PROYECTO:
CONST. PERFORACIÓN POZO DE RIEGO ETEROVICH

APERTURA
12 0007 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00%	0%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE RECURSOS Y TOMA DE DECISION DE LOS BENEFICIARIOS.

PROYECTO:
CONST. OBRA DE TOMA PARA RIEGO CATACHILLA

APERTURA
12 0008 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	0%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE CONSENSO Y TOMA DE DECISION DE LOS BENEFICIARIOS.

PROYECTO:
CONST. SISTEMA DE RIEGO CONVENTO PAMPA

APERTURA
12 0010 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00%	0%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE COORDINACION CON EL DIRIGENTE, DONDE NO SE TUVO NINGUNA PRESENCIA DE LOS BENECIFIARIOS.

PROYECTO: CONST. PERFORACIÓN DE POZO RIEGO ARACHACA

APERTURA
12 0011 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
50,000.00	50,000.00	0.00	100.00%	100%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN COORDINACION CON EL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS DONDE SE REALIZO LA PEFORACION EN ROCA CON EQUIPO DE PERCUSION, PERFORANDO UNA PPROFUNDAD DE 114ML Y UN CAUDAL DE 4.5 Lts/Seg.



PROYECTO:
CONST. PERFORACIÓN DE POZO DE RIEGO (ZONA MOLLE MOLLE
Y LAGUNA I)

APERTURA
12 0012 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
40,000.00	39,999.96	0.04	100.00%	100%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN COORDINACION CON EL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS DONDE SE REALIZO LA PEFORACION CORRESPONDIENTE, PERFORANDO UNA PPROFUNDAD DE 80 ML Y UN CAUDAL DE 1.5 Lts/Seg.



PROYECTO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO EN AREA URBANA - RURAL

APERTURA
16 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
200,000.00	115,427.53	84,572.47	100.00%	57.71%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTEMINIENIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES , SEGÚN REQUERIMIENTO O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS, TRATANDO DE SATISFACER LA DEMANDA REQUERIDA.



PROYECTO: AMPLIACION DE LINEA PILOTO LINDE GRANDE - LINDE CHICO

APERTURA
16 0000 002

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	100%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA COMUNIDAD DE LINDE GRANDE LINDE CHICO , SEGÚN REQUERIMIENTO O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS. COMO (CABLE DE ALUMINIO N° 6, RAT DE UNA VIA COMPLETO, GRAMPAS BI METALICA, ESTRIBO N° 4, CAJA DE CONTROL Y PANTALLAS DE TUBO FLOURESCENTES 1X40)



PROYECTO: AMPLIACION DE LINEA PILOTO PHUYU PHUYU CHICO

APERTURA
16 0000 003

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	100%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA COMUNIDAD DE PHUYU PHUYU CHICO , SEGÚN REQUERIMIENTO O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS. COMO (CABLE DE ALUMINIO N° 6, RAT DE UNA VIA COMPLETO, GRAMPAS BI METALICA, ESTRIBO N° 4, CAJA DE CONTROL Y PANTALLAS DE TUBO FLOURESCENTES 1X40)



PROYECTO:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y
AGRICOLA

APERTURA
34 0000 005

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
90,000.00	89.892,23	107,77	100.00%	99.88%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUBRICANTES , FILTROS, GRASA Y OTROS PARA EL FUICIONAMIENTO DEL EQUIPO PESADO (PALACARGADORA, VOLQUETAS.



**PROYECTO:
CONST. CORDONES CHINGURI**

APERTURA
17 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE RECURSOS Y CONSENSO DE LOS BENEFICIARIOS.

**PROYECTO:
CONST. CORDONES POCOATA BAJA**

APERTURA
17 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO HASTA LA FECHA NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE CONSENSO Y TOMA DE DECISION DE LOS BENEFICIARIOS.

**PROYECTO:
CONST. EMPEDRADO CONVENTO PAMPA**

APERTURA
17 0003 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE AUSENCIA DEL DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA.

PROYECTO: CONST. MERCADO CENTRAL ARANI

APERTURA
17 0004 000

MONTO PRESUPUESTO UPRE	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
2.538.191,72	2.537.560,45	631,27	100.00%	99.98%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO MERCADO CENTRAL ARANI CORRESPONDE AL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS CON LAS AREAS REQUERIDAS (**Planta Baja**, Puestos de venta, Batería de Baños, Depósito de Basura, Rampa, Escalera, Depósitos seco y húmedo, **Planta Alta** Puestos área de comidas , Puestos distintas ventas, Administración y depósitos, Batería de Baños, Ambientes de Sereno, Depósitos de decomiso) INCLUIDO UNA GUARDERIA. EL CUAL ESTA SIENDO EJECUTADO DE ACUERDO A LOS INTEMS SEGÚN CONTRATO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS CONSTRUTIVOS Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



**PROYECTO:
CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE ABAROA**

APERTURA
17 0005 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00%	100.00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LOS ITEMS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO: INSTALACION DE FAENAS, REPLANTEO TRAZADO Y CONTROL TOPOGRAFICO, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE, PROV. Y CONFORMACION DE CAPA SUB BASE, PROV. Y CONFORMACION DE CAPA BASE, PAVIMENTO RIGIDO e=15 cm. H-25, CUNETETA DE H.S. H-21, CANAL DE DESAGUE DE H°Cº 30% DE P/D. MAS REJILLA, SUMIDERO PLUBIAL H°Cº 50% P.D., PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA PVC 6 Pulg., PLACA DE ENTREGA DE OBRA, LIMPIEZA GENERAL, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS CONSTRUCTIVOS, EL CUAL SE VIENE EJECUTANDO EN COORDIANCION CON LOS BENEFICIARIOS.



**PROYECTO:
CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE ABAROA**

APERTURA

17 0005 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00%	100.00%



PROYECTO:
CONST. CONSTRUCCION TINGLADO SUB CENTRAL 12 DE ENERO

APERTURA
17 0007 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
29.635,00	19.998,00	9.637,00	100.00%	67.48%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA ADQUISICION DE MATERIALES COMO SER PERFIL 100*50*2, PERFIL U 70*40, PERFIL C 80*40, CALAMINA N° 28 DE 5MTS. ELECTRODOS, GALONES ANTICOROSIVO, BARRAS DE FIERRO DE ½», BARRAS DE FIERRO 5/16, CAJA DE GANCHOS J, DISCO DE CORTE, CEMENTO Y ALAMBRE EL CUAL SERA EJECUTADO CON LA CONTRATACION DE UN CERRAJERO.



PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS VECINALES

APERTURA

18 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
260,000.00	243,707.36	16,292.64	100.00%	94%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON EL MANTEMINIENTO DE CAMINOS VECINALES, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES (CUCHILLERA, TAMBILLO LINDE, MOLLE MOLLE, COLPA CIACO, PUKA HUASI, VILLA CARMEN, SERRANO), SEGÚN REQUERIMIENTO, O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS, TRATANDO DE SATISFACER LA DEMANDA REQUERIDA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES



**PROYECTO:
CONST. PUENTES VEHICULARES MENORES D-4**

APERTURA
18 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
50,000.00	49.088,00	912,00	100.00%	98.18%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA COMPRA DE MATERIALES COMO TUBOS DE HORMIGON ARMADO, PARA LA COMUNIDAD DE CHAUPÍ RANCHO, ADQUISICION DE MATERIALES (CEMENTO , FIERRO, GRAVA, ARENA PIEDRA, CLAVOS, ALAMBRE) PARA LA COMUNIDAD DE AV. PAZ, EL CUAL SE EJECUTO CON CONTRAPARTE DE MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD.



PROYECTO:
CONST. PUENTES MENORES POCOATA CENTRO PILA PATA

APERTURA
18 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
40,000.00	40,000.00	0.00	100.00%	100.00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO COMPRA DE TUBERIAS DE HORMIGON PARA LA CONTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES MENORES PARA LAS COMUNIDADES DE POCOATA CENTRO, SAGA SAGA, CUCHILLERA Y PILA PATA. EL CUAL FUE EJECUTADO CON CONTRAPARTE DE MANO DE OBRA DE LOS BENEFICIARIOS.



**PROYECTO:
APERT. CAMINOS PILA PATA – CERCO PAMPA**

APERTURA
18 0003 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
40,000.00	39,950.00	50.00	100.00%	99.88%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO A LA CONTRATACION DE UNA EXCAVADORA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE CAMINO, DONDE SE APERTURO UNA LONG. DE 3 ½ KM. EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD.



PROYECTO:
CONST. PUENTE VEHICULAR RIO POCOATA Â PUKA ORKO

APERTURA
18 0005 000

MONTO PRESUPUESTO financiamiento FDI	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
4.004.661,35	0.00	4.004.661,35	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO ESTA SUJETO BAJO UN CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL (FDI) FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE INICIO DE OBRA EN COORDINACION CON EL G.AUTONOMO MUNICIPAL ARANI - FPS(SUPERVISION) – EMPRESA CONTRATADA Y BENEFICIARIOS .

LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COMPRENDE LO SIGUIENTE; LUZ DE PUENTE DE 35 MTS, ANCHO DE VIA 7.30 MTS.



PROYECTO:
MANTENIMIENTO Y REFACCION POSTAS Y CENTRO DE SALUD

APERTURA
20 0000 014

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
300.000,00	199.222,50	100.777,50	100.00%	66.41%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO AL MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LOS CENTROS DE SALUD ARANI, POSTA DE SALUD LAGUNITA, POSTA DE SALUD SERRANO, POSTA DE SALUD POCOATA, CON EL PINTADO DE INTERIOR EXTERIOR, PINTADO AL OLEO DE PUERTAS, PINTADO DE REJILLAS AREGLO DE MESONES, EN CONFORMIDAD Y COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS.



**PROYECTO:
MANTENIMIENTO Y REFACCION POSTAS Y CENTRO DE SALUD**

APERTURA
20 0000 014

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
300.000,00	199.222,50	100.777,50	100.00%	66.41%



PROYECTO:
CONST. PUESTO DE SALUD SAGA SAGA

APERTURA
20 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
469.711,43	0.00	469.711,43	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION

PROYECTO:
CONST. PUESTO DE SALUD LINDE CHICO Y LINDE GRANDE

APERTURA
20 002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION

PROYECTO:
MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS

APERTURA
21 0000 005

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
150,000.00	149.986,82	13,18	100.00%	99.99%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS SEGÚN REQUERIMIENTO KINDER ANTOFAGASTA, NEMECIO A. MARISCAL, EDUARDO AVAROA, U.E. COLLPA BAJA.

<u>U.E. COLLPA BAJA</u>		<u>U.E. EDUARDO ABAROA</u>		<u>KINDER ANTOFAGASTA</u>	
1	PINTURA LATEX EXTERIOR	9	PINTURA LATEX EXTERIOR	18	PICADO Y REVOCADO CON YESO SOBRE MURO DE ADOBE
2	PICADO Y REVOCADO CON YESO	10	PICADO Y REVOCADO CON YESO SOBRE MURO DE ADOBE	19	PINTURA LATEX INTERIOR
3	PINTURA LATEX INTERIOR	11	PINTURA LATEX INTERIOR	20	RETIRO Y COLOC. PUERTA DE MADERA ROBLE INCLUYE MARCO, PINTURA Y QUINCALLERIA
4	PINTADO REJILLA DE PROTECCION DE VENTANAS	12	PROV. E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE	21	PROV. Y COLOC. VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO
5	PINTADO AL ACEITE DE PUERTAS	13	PINTADO REJILLA DE PROTECCION	22	PINTURA LATEX EXTERIOR
6	PINTADO AL ACEITE MARCOS DE VENTANAS	14	PINTADO AL ACEITE DE PUERTAS	23	REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO
7	RETIRO Y COLOCADO DE VIDRO DOBLE 4MM	15	PINTADO AL ACEITE MARCOS DE MADERA (VENTANAS)	24	PROV. E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE
8	PINTADO SOBRE MURO (VIÑETADO S/DISEÑO)	16	RETIRO Y COLOCADO DE VIDRO DOBLE 4MM	25	PICADO Y REPOSICION DE PISO ENLUCIDO DE CEMENTO
		17	PINTADO SOBRE MURO (VIÑETADO S/DISEÑO)	26	PINTADO DE REJILLAS
				27	PINTURA AL OLEO SOBRE MURO
				28	PINTADO SOBRE MURO (VIÑETADO S/DISEÑO)
				29	REJILLA DE PISO PARA DESAGUE

PROYECTO:
MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS

APERTURA
21 0000 005

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
150,000.00	149.986,82	13,18	100.00%	99.99%



PROYECTO: **CONST. MURO PERIMETRAL U.E. EDUARDO AVAROA**

APERTURA

21 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL COMO EL ENMALLADO DE LA U.E DONDE COMPRENDE TUBOS DE 2" DE FG, TRAVESAÑOS DE 1 ½", MALLA OLIMPICA DE 5X5 CM, DADOS DE HORMIGON CICLOPEO DE 0.5*0.8 CM, PUERTA DE INGRESO DE 3 MTS Y UNA DE 1 M.



**PROYECTO:
CONSTRUCCION AULAS UNIDAD EDUCATIVA ARANI**

APERTURA
21 0003 000

MONTO PRESUPUESTO UPRE	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
1.663.500,59	1.663.500,57	0,02	100.00%	100.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO CONSTRUCCION AULAS U.E. ARANI CORRESPONDE AL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS CON LAS AREAS REQUERIDAS QUE COMPRENDE (**Planta Baja** talleres, sala de música, gabinete de maestros, dirección general, auditorio, baños y 5 aulas, en la **primera planta** están las 7 aulas , 2 salas de computación, sala de lectura con su biblioteca). EL CAUL ESTA SIENDO EJECUTADO DE ACUERDO A LOS ITEMS SEGÚN CONTRATO, ESPECIFICACIONES TENCICAS Y PLANOS CONSTRUCTIVOS.



**PROYECTO:
CONST. TINGLADO U.E. JUZGADO**

APERTURA

21 0006 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
276.724,50	276.724,50	1.156,02	100.00%	99.58%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON EL SE PROCEDIO CON LA EJECUION DE LA OBRA DE ACUERDO A LOS ITEMS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES TENICAS Y PLANOS CONSTRUCTIVOS Y EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS



**PROYECTO:
CONST. ENMALLADO U.E. COLLPA BAJA**

APERTURA
21 0010 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ACUERDO A LOS ITEMS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO, EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



PROYECTO: CONST. AULAS UNIDAD EDUCATIVA PUKA WASI

APERTURA

21 0011 000

MONTO FINANCIAMIENTO	MONTO DESEMBOLSADO 20%	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
				FISICO	FINANCIERO
213.739,30	42.747,86	42.747,86	100,57	100.00%	100.00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ACUERDO A LOS ITEMS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO, EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS, QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS.



PROYECTO: CONST. AULAS UNIDAD EDUCATIVA SERRANO

APERTURA

21 0012 000

MONTO FINANCIAMIENTO	MONTO DESEMBOLSADO 20%	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
				FISICO	FINANCIERO
2.785.385,88	557.077,18	556.789,82	287,36	100.00%	99.95%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ACUERDO A LOS ITEMS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO, EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS, QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION AULAS TALLERES CANCHA MULTIPLE Y TINGLADO.



PROYECTO: CONST. CANCHA MÚLTIPLE VILLA BARRIENTOS

APERTURA

22 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
27,000.00	25.819,00	1.181,00	100.00%	95.63%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS CON LA COMPRA DE MATERILAE S AGREGADOS, CEMENTO Y OTROS, DONDE LA COMUNIDAD APORTO CON LA CONTRAPARTE DE MANO DE OBRA COMUNAL EN LA EJECUCION DE LA MISMA.



PROYECTO:
CONST. CAMPO DEPORTIVO POCOATA ALTA (E.T.P.)

APERTURA
22 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
40,000.00	30,000.00	10,000.00	100.00%	75.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO FUE EJECUTADO PREVIA COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS QUIENES GARANTIZARON EL LUGAR DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO PARA SU POSTERIOR EJECUCION.



PROYECTO:
CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO TAMBILLO LINDE

APERTURA
22 0003 000

MONTO PRESUPUESTO UPRE	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
1.495.124,93	1.482.312,29	12.812,64	100.00%	99.14%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO TAMBILLO LINDE, CORRESPONDE AL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE, QUE COMPRENDE LA EJECUCION DE UNA CANCHA DE CESPED SINTETICO.



PROYECTO:
CONST. ENMALLADO CANCHA DE FUTBOL TAMBILLO LINDE

APERTURA
22 0004 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
105.100,00	0.00	105.100,00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE RECURSOS.

PROYECTO:
CONST. CANCHA POLI FUNCION EN LA COMUNIDAD VILLA EVITA

APERTURA
22 0005 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
95,000.00	95,000.00	0.00	100.00%	100.00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A LOS ITEMS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO: INSTALACION DE FAENAS, REPLANTEO Y TRAZADO, EXCAVACION (0-2 M) SEMIDURO, COMPACTADO, CORDONES DE H° C° (1:2:3@ 30% PIEDRA, SOLADURA DE PIEDRA, CONTRAPISO DE CEMENTO (ESP.=8 CM.) R=210 KG/CM2, DEMARCACION CAMPO DEPORTIVO, PROV. Y COLOC. DE ARCOS METALICOS (INCLUYE TABLEROS), LIMPIEZA GRAL. Y RETIRO DE ESCOMBROS, LETRERO DE OBRA, PLACA DE ENTREGA DE OBRA, ESPECIFICACIONES TENICAS Y PLANOS CONSTRUCTIVOS Y EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS



**PROYECTO:
MANTENIMIENTO, DRAGADO Y CUIDADO DE ZONAS DE
PELIGRO**

APERTURA

31 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
10,000.00	9,850.00	150.00	100.00%	98.50%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DE ACUERDO A REQUIRIMIENTO DE LAS COMUIDADES DONDE SE INTERVINO VILLA EVITA , POCOATA ALTA Y RIO POCOATA.



**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**
