

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARANI

DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS



INFORME SEMESTRAL

2018



GESTION
SRA. DUNIA ROJAS MAMANI

PROYECTO:
**ADQUISICION DE TUBERIAS DE RIEGO (GERMAN TARDIO, MOLLE
 MOLLE, MOLLE MOLLE LAGUNA II)**

APERTURA
12 0000 002

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
45,000.00	44,999.97	0.03	100.00%	100%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO CON LA ADQUISICION DE 1000 MTS SUPERTUBO HDPE DE 90 mm = 3" , 8 PIEZAS ACOUPLE DE 90 mm = 3" , 1 ADAPTADOR MACHO DE 90X3mm, EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS




PROYECTO: SONDEO ELECTRICO PARA PERFORACION POZO DE RIEGO SERRANO ALTO

APERTURA
12 0000 003

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
5,000.00	3,500.00	1,500.00	100.00%	70%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO DONDE SE REALIZO DOS SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES PARA LA PERFORACION DE POZOS, EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.

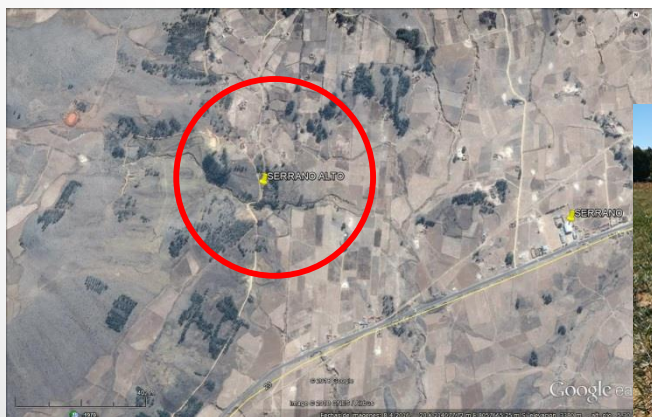

PROYECTO:
ADQUISICION DE TUBERIA PARA RIEGO VILLA FLORES

APERTURA
12 0000 004

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
5,000.00	5,000.00	0.00	100.00%	100.00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO CON LA ADQUISICION DE 1710 ML DE POLITUBO DE 1" ,EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS



PROYECTO: **ADQUISICION DE TUBERIA PARA RIEGO VILLA BARRIENTOS**

APERTURA
12 0000 005

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
5,000.00	4,582.00	418.00	100.00%	91.64%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO CON LA ADQUISICION DE 600 MTS DE POLITUBO BI CAPA DE 3/4". 400 DE POLITUBO BI CAPA DE 1 1/2", 5 UNIONES PATENTES DE 3/4", TRES UNIONES PATENTES DE 1 1/2", UN REDUCTOR DE 2"X 1 1/2". EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS



PROYECTO:
SONDEO ELECTRICO PARA PERFORACION POZOS DE RIEGO
COLCA, COLLPA Y CHULLPA ORKO

APERTURA
12 0000 006

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
15,000.00	14,000.00	1,000.00	100.00%	93.33%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO, DONDE SE REALIZO DOS SONDEOS ELECTRICOS POR COMUNIDAD LAS CUALES COMPRENDE COLCA, COLLPA Y CHULLPA ORKO, EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



PROYECTO:
CONST. DE SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL (PILA PATA – SAGA SAGA - CUCHILLERA)

APERTURA
12 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
33,750.00	0.00	33,750.00	0.00%	0%

OBSERVACIONES:

EN PROCESO DE COORDINACION PARA SU EJECUCION



PROYECTO: FUNCIONAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

APERTURA
16 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
160,997.00	76,729.86	84,267.14	47.66%	47.66%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA EJECUCION DEL PROYECTO CON LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MATENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARA LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO , SEGÚN REQUERIMIENTO O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS. COMO (PANTALLAS DE TUBO FLOURESCENTES 1X40, PANTALLAS DE SODIO DE 150 WHATS, REACTANCIAS, FOTOCELULAS, CABLE BI POLAR, ALAMBRE DE AMARRE, CINTA AISLANTE).



PROYECTO:
DEUDA DE ALUMBRADO PUBLICO GESTION 2009- 2016

APERTURA
16 0000 002

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
96,000.00	0.00	96,000.00	0.00%	0%

OBSERVACIONES:

EN PROCESO DE CONCILIACION CON EL FEC DE LAS DEUDAS 2009 – 2016, PARA SU POSTERIOR CANCELACION.

**PROYECTO:
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO**

APERTURA
16 0000 003

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
63,003.00	0.00	63,003.00	0.00%	0%

OBSERVACIONES:

RECURSOS DESTINADOS PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, LAS CUALES ESTAN SUJETOS A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES.

PROYECTO: AMPLIACION DE LINEA PILOTO D-5

APERTURA
16 0000 004

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
10,000.00	9,962.63	37.37	100.00%	99.63%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO CON LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL DISTRITO - 5 , SEGÚN REQUERIMIENTO O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS. COMO (CABLE DE ALUMINIO N° 6, RAT DE UNA VIA COMPLETO, GRAMPAS BI METALICA, ESTRIBO N° 4, PANTALLAS DE TUBO FLOURESCENTES 1X40)



PROYECTO: AMPLIACION DE LINEA PILOTO SIND. SUCRE

APERTURA
16 0000 005

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
11,250.00	11,249.29	0.71	100.00%	99.99%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA EJECUCION DEL PROYECTO CON LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNIDAD SINDICATO SUCRE, SEGÚN REQUERIMIENTO O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS. COMO (CABLE DE ALUMINIO N° 6, RAT DE UNA VIA COMPLETO, GRAMPAS BI METALICA, ESTRIBO N° 4, PANTALLAS DE TUBO FLOURESCENTES 1X40, CAJA DE CONTROL.



PROYECTO:
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION

APERTURA
17 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
112,800.00	39,403.33	73,396.67	34.98%	34.98%

OBSERVACIONES:

RECURSO DESTINADO PARA EL PAGO DE CONSULTORES EN LINEA QUE SON DE APOYO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

APERTURA
17 0000 002

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
35,600.00	18,725.80	16,874.20	52.60%	52.60%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DE LOS RECURSOS CON LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD COLCA. COMPRA DE MATERIALES PARA REJILLAS METALICAS U.E.GUALBERTO VILLARROEL, COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION JAVIER DEL



PROYECTO:
REFAC. DE AMBIENTES DE CENTRO ANITA

APERTURA
17 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EN COORDINACION CON EL RESPONSABLE, EN EL CAMBIO DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FASLO Y PINTURA INTERIOR. DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO SOLICITADO.



PROYECTO:
CONST. DE PAVIMENTO RÍGIDO DE CALLES ALEDAÑAS A LA
PLAZA PRINCIPAL DE ARAN

APERTURA
17 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO NO FUE EJCUTADO

**PROYECTO:
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
VECINALES**

APERTURA
17 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
180,000.00	88,140.04	91,859.96	48.97%	48.97%

OBSERVACIONES:

RECURSO DESTINADO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE, DEL CONSUMO DEL EQUIPO PESADO, SALARIOS DE CONSULTORES EN LINEA (CHOFERES VOLQUETA I,II, MOTONIVELADORA, PALACARGADORA)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

APERTURA
17 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
90,000.00	60,536.08	29,463.92	67.26%	67.26%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO CEMENTO. ARENA, GRAVA , FIERRO, CLAVOS PARA LA COMUNIDA DE CHULLPA ORKO PARA LA CONTRUCCION DE PUENTES MENORES, Y PAGO DE COMBUSTIBLE DEL EQUIPO DEL EQUIPO PESADO



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAMINO BALCONES

APERTURA

18 0000 003

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
11,250.00	372.00	10,878.00	100.00%	3.31%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN COORDINACION CON EL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS CON EL ALQUILRE DE UNA RETROEXCAVORA MEJORAMIENTO, CORTE DE TALUDES ENSANCHE DE VIA, EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



PROYECTO:
APERT. DE CAMINO SECTOR TAGAPI (POCOATA ALTA)

APERTURA
18 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
11,250.00	0.00	11,250.00	100.00%	0%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EN ATENCION A LA SOLICITUD DEL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS CON EL ALQUILRE DE UNA RETROEXCAVORA PARA LA APERTURA DE CAMINO EN SECTOR DE TAGAPI. EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



PROYECTO: CONST. PUENTE MENORES HUASA HUAYU

APERTURA
18 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
11,250.00	11,248.22	1.78	100.00%	99.98%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EN ATENCION A SOLICITUD DEL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS CON LA CONSTRUCCION UN PUENTE PEATONAL DE 5 X1.20 MTS, QUE COMPRENDE EXCAVACION, BASE DE H°C°, MUROS DE H°C° Y LOSA DE H°A° E=20CM. EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



PROYECTO:
CONST. PUENTES MENORES ORTEGA CHICO Y ORTEGA GRANDE

APERTURA
18 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EN ATENCION A SOLICITUD DEL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS CON LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CEMENTO, ARENA, GRAVA, FIERRO, PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES MENORES PARA LAS COMUNIDADES DE ORTEGA CHICO Y GRANDE. EL CUAL SERA EJECUTADO EN ADMINISTRACION DIRECTA POR LOS COMUNARIOS.



PROYECTO: **CONST. PUENTE VEHICULAR RIO POCOATA Â PUKA ORKO**

APERTURA
18 0005 000

MONTO PRESUPUESTO (FDI)	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
3,199,730.00	799,852.16	2,399,877.84	75.00%	25.00%

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ESTA SUJETO A CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL (FDI) FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, QUE COMPRENDE PUENTE POSTENZADO DE 35 M DE LONG. FUNDACION DIRECTA COMPUESTA POR ZAPATA, MURO Y CABEZAL EN CADA ESTRIBO, PUENTE COMPUESTO POR 4 VIGAS DE H°P° DE 1.85 M DE ESPESOR, CON PERALTE DE 1.65M UBICADOS EN LOS DOS EXTREMOS Y TRES EN EL TRAMO, LOSA DE 0.18M DE ESPESOR Y 7.30 M DE ANCHO DE CALZADA, BORDILLOS, GABIONES DE PROTECCION.



PROYECTO:
FUNCIONAMIENTO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

APERTURA
19 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
20,000.00	1,497.00	18,503.00	7.48%	7.48%

OBSERVACIONES:

EL RECURSO ASIGNADO ES PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MATERIALES DE ESCRITORIO, HOJAS, FOLDERS, TINTAS PARA IMPRESORA Y OTROS.

PROYECTO: **CONST. ENMALLADO UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO AVAROA**

APERTURA
21 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
60,000.00	49,985.69	10,014.31	100.00%	83.31%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EN ATENCION A SOLICITUD DEL DIRECTOR DE LA U.E. DONDE SE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL ENMALLADO DE LA U.E. QUE COMPRENDE DADOS DE H°C°, BASE Y TRAVESAÑOS DE TUBERIA DE 2" y 11/2", MALLA OLIMPICA, LIMPIEZA GENERAL.



PROYECTO:
CONST. AULAS UNIDAD EDUCATIVA PUKA WASI

APERTURA
21 0011 000

MONTO PRESUPUESTO (UPRE)	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
171,092.57	0.00	171,092.57	100.00%	0%

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCCION DE AULAS ESTA SUJETO A CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DE LA (UPRE) UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS, EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS. ACTUALMENTE LA OBRA FUE ENTREGADO DEFINITIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO.



PROYECTO: **CONST. AULAS UNIDAD EDUCATIVA SERRANO**

APERTURA
21 0012 000

MONTO PRESUPUESTO (UPRE)	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
2,228,309.00	985,243.57	1,243,065.43	100.00%	44.21%

OBSERVACIONES:

LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTA SUJETO A CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DE LA (UPRE) UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES, QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE OCHO AULAS, TALLERES, DIRECCION Y ADMINISTRACION, COCINA, COMEDOR, CANCHA POLIFUNCIONAL, TINGLADO, GRADERIAS, EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD CON LOS BENEFICIARIOS. ACTUALMENTE LA OBRA FUE ENTREGADO PROVISIONALMENTE.



PROYECTO: CONST. DE CANCHA MULTIPLE BALCON PAMPA

APERTURA
22 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
15,000.00	14,760.00	240.00	100.00%	98.40%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EN ATENCION A SOLICITUD DEL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS DONDE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CEMENTO, ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE EL CUAL SERA EJECUTADO POR LOS BENEFICIARIOS BAJO ADMINISTRACION DIRECTA.



**PROYECTO:
MANTENIMIENTO, DRAGADO Y CUIDADO DE ZONAS DE
PELIGRO**

APERTURA
31 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
50,000.00	49,998.90	1.10	100.00%	100%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EN ATENCION A SOLICITUD DE LOS DIRIGENTES Y LOS BENEFICIARIOS DONDE SE REALIZO EL DRAGADO DE ZANJAS, ACEQUIAS, RIO POCOATA EN LAS COMUNIDADES DE POCOATA, JUZGADO, VILLA EVITA.



**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**
