

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARANI
DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS



INFORME 1ER SEMESTRE
2017

GESTION
SRA. DUNIA ROJAS MAMANI

PROYECTO:
ADQUISICION DE TUBERIA PARA RIEGO JANCHILLANI

APERTURA

11 0000 002

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00%	0%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO HASTA LA FECHA NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE CONSENSO Y TOMA DE DECISION DE LOS BENEFICIARIOS.

PROYECTO:
APOYO SISTEMA DE RIEGO KOMER KOCHA D-1

APERTURA

12 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00%	0%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO HASTA LA FECHA NO FUE EJECUTADO.

PROYECTO:
CONST. CANAL DE RIEGO VILLA CARMEN ARANI (ETP) D-1

APERTURA

12 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00%	0%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD PARA DETERMINAR EL AREA DEL PROYECTO EN CONSENSO CON LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA CARMEN EL CAUL ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACION.

PROYECTO: CONST. SONDEO ELÉCTRICO PERFORACIÓN DE POZO DISTRITO 2



APERTURA

12 0003 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
24,000.00	0.00	24,000.00	100.00%	0%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA ELABORACION DE SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES EN LAS COMUNIDADES JUTULAYA, CINTHA JHOCHI, LAGUNA, KUMO KEWIÑA, SERRANO, VILLA CARIÑO, VILLA SURUMI. EN COORDINACION Y CONFORMIDAD CON LOS BENEFICIARIOS.

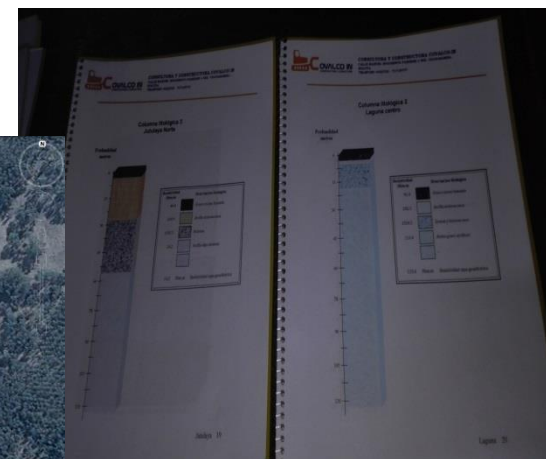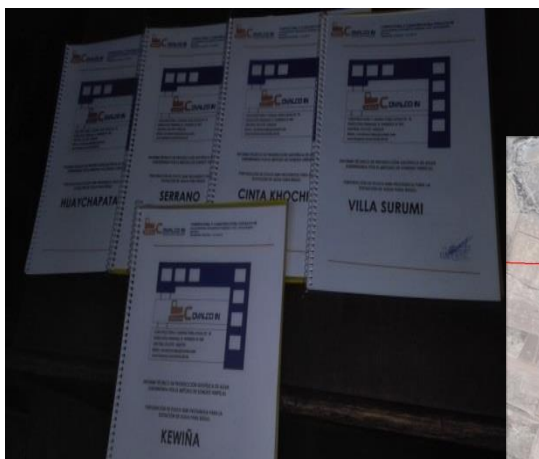

PROYECTO:
CONST. SISTEMA DE RIEGO SERRANO ALTO (ETP)


APERTURA

12 0006 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	0%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO SERRANO ALTO EL CUAL CONTEMPLA OBRA DE TOMA TIPO (EMBALSE), RED DE DISTRIBUCION E HIDRANTES DE RIEGO. EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS.

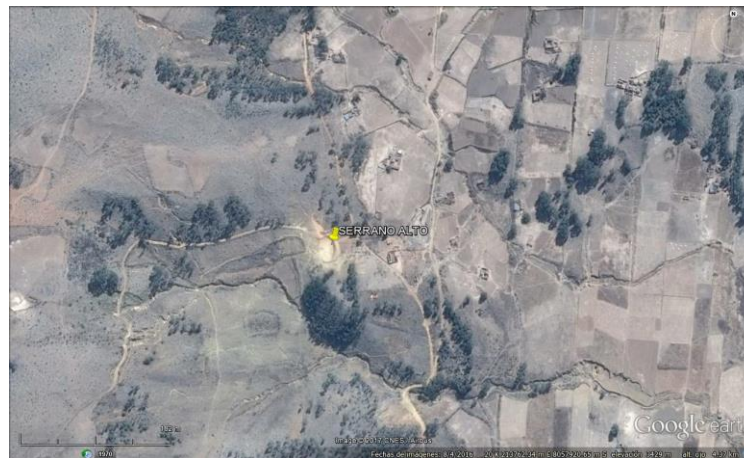

PROYECTO:
CONST. OBRA DE TOMA PARA RIEGO CATACHILLA

APERTURA

12 0008 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	0%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO HASTA LA FECHA NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE CONSENSO Y TOMA DE DECISION DE LOS BENEFICIARIOS.

PROYECTO:
**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO
PUBLICO EN AREA URBANA - RURAL**

APERTURA

16 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
200,000.00	20,574.88	179.425,12	10.29%	10.29%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTEMINIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES , SEGÚN REQUERIMIENTO O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS, TRATANDO DE SATISFACER LA DEMANDA REQUERIDA.



PROYECTO: AMPLIACION DE LINEA PILOTO LINDE GRANDE - LINDE CHICO

APERTURA

16 0000 002

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA COMUNIDAD DE LINDE GRANDE LINDE CHICO , SEGÚN REQUERIMIENTO O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS. COMO (CABLE DE ALUMINIO N° 6, RAT DE UNA VIA COMPLETO, GRAMPAS BI METALICA, ESTRIBO N° 4, CAJA DE CONTROL Y PANTALLAS DE TUBO FLOURESCENTES 1X40)



PROYECTO:
AMPLIACION DE LINEA PILOTO PHUYU PHUYU CHICO


APERTURA

16 0000 003

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA COMUNIDAD DE PHUYU PHUYU CHICO , SEGÚN REQUERIMIENTO O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS. COMO (CABLE DE ALUMINIO N° 6, RAT DE UNA VIA COMPLETO, GRAMPAS BI METALICA, ESTRIBO N° 4, CAJA DE CONTROL Y PANTALLAS DE TUBO FLOURESCENTES 1X40)

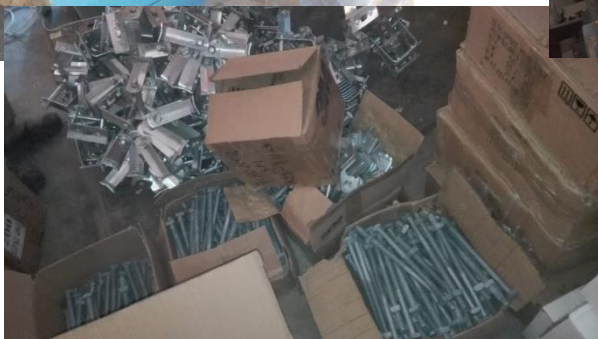

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

APERTURA

17 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
10,000.00	9.998,16	1.84	100.00%	100.00%

OBSERVACIONES:

SE REALIZO LA REFACCIÓN DE LAS GRADERIAS DEL SALON ROJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE LAS GRADAS PROVOCADA POR LAS LLUVIAS, EJECUTADO DE ACUERDO A LOS ITEMS Y ESPECIFICACIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.



PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

APERTURA
17 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
10,000.00	9.998,16	1.84	100.00%	100.00%

OBSERVACIONES:

SE REALIZO LA REFACCIÓN DE LAS GRADERIAS DEL SALON ROJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE LAS GRADAS PROVOCADA POR LAS LLUVIAS, EJECUTADO DE ACUERDO A LOS ITEMS Y ESPECIFICACIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.



PROYECTO:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y AGRICOLA

APERTURA
34 0000 005

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
90,000.00	10.611,84	79.388,16	11.79%	11.79%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA COMPRA DE LUBRICANTES , FILTROS, GRASA Y OTROS PARA LE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PESADO (PALACARGADORA).



**PROYECTO:
CONST. CORDONES CHINGURI**

APERTURA

17 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO HASTA LA FECHA NO FUE EJECUTADO, LOS BENEFICIARIOS PRESENTARON LA SOLICITUD PARA TRASPASO PRESUPUESTARIO DE COMPRA DE TUBERIAS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD

**PROYECTO:
CONST. CORDONES POCOATA BAJA**

APERTURA

17 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO HASTA LA FECHA NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE CONSENSO Y TOMA DE DECISION DE LOS BENEFICIARIOS.

PROYECTO:
CONST. EMPEDRADO CONVENTO PAMPA

APERTURA

17 0003 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO HASTA LA FECHA NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE AUSENCIA DEL DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA.

**PROYECTO:
CONST. MERCADO CENTRAL ARANI**

APERTURA

17 0004 000

MONTO PRESUPUESTO UPRE	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
2.538.191,72	2.126.309,55	411.882,17	100.00%	83.77%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO MERCADO CENTRAL ARANI CORRESPONDE AL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS CON LAS AREAS REQUERIDAS (**Planta Baja**, Puestos de venta, Batería de Baños, Depósito de Basura, Rampa, Escalera, Depósitos seco y húmedo, **Planta Alta** Puestos área de comidas , Puestos distintas ventas, Administración y depósitos, Batería de Baños, Ambientes de Sereno, Depósitos de decomiso) INCLUIDO UNA GUARDERIA. EL CUAL ESTA SIENDO EJECUTADO DE ACUERDO A LOS INTEMS SEGÚN CONTRATO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS CONSTRCTIVOS Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



Plazo de Ejecución : 315
Fecha de Conclusión: 16/03/2017

**PROYECTO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS
VECINALES**

APERTURA

18 0000 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
260,000.00	112.445,17	147.554,83	50.00%	43,25%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON EL MANTEMINIENTO DE CAMINOS VECINALES, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES (CUCHILLERA, TAMBILLO LINDE, MOLLE MOLLE, COLPA CIACO, PUKA HUASI, VILLA CARMEN, SERRANO), SEGÚN REQUERIMIENTO, O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS, TRATANDO DE SATISFACER LA DEMANDA REQUERIDA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES



**PROYECTO:
CONST. PUENTES VEHICULARES MENORES D-4**

APERTURA
18 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
50,000.00	19.948,00	30.052,00	100.00%	39,90

OBSERVACIONES:

SE PROCEDE CON LA ADQUISION DE MATERIALES COMO TUBOS DE HORMIGON ARMADO, PARA LA COMUNIDAD DE CHAUPI RANCHO, ADQUISION DE MATERIALES (CEMENTO , FIERRO, GRAVA, ARENA PIEDRA, CLAVOS, ALAMBRE) PARA LA COMUNIDAD DE AV. PAZ.



PROYECTO:
CONST. PUENTES MENORES POCOATA CENTRO PILA PATA

APERTURA
18 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO A LA ADQUISICION DE TUBERIAS DE HORMIGON PARA LA CONTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES MENORES PARA LAS COMUNIDADES DE POCOATA CENTRO, SAGA SAGA, CUCHILLERA Y PILA PATA. DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS



PROYECTO:
APERT. CAMINOS PILA PATA – CERCO PAMPA


APERTURA

18 0003 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
40,000.00	39,950.00	50.00	100.00%	99.88%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO A LA CONTRATACION DE UNA EXCAVADORA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE CAMINO, DONDE SE APERTURO UNA LONG. DE 3 ½ KM. EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD.

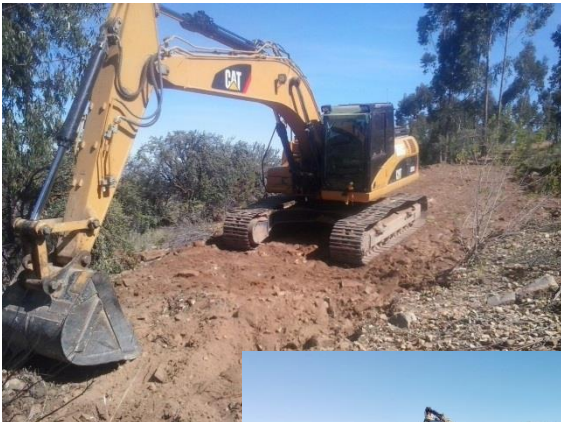

PROYECTO:
MANTENIMIENTO Y REFACCION POSTAS Y CENTRO DE SALUD

APERTURA

20 0000 014

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
100,000.00	0.00	10,000.00	50.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO AL MANTENIMIENTO Y REFACCION DEL CENTRO DE SALUD , CON EL PINTADO DE INTERIOR EXTERIOR, PINTADO AL OLEO DE PUERTAS, PINTADO DE REJILLAS AREGLO DE MESONES, EN CONFORMIDAD Y COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS.



PROYECTO:
MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS

APERTURA

21 0000 005

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
150,000.00	62.899,99	87.100,01	70.00%	41.93%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS SEGÚN REQUERIMIENTO LAS CUALES FUERON KINDER ANTOFAGASTA, NEMECIO A. MARISCAL, EDUARDO AVARO, U.E. COLLPA BAJA.

U.E. COLLPA BAJA		U.E. EDUARDO ABAROA		KINDER ANTOFAGASTA	
1	PINTURA LATEX EXTERIOR	9	PINTURA LATEX EXTERIOR	18	PICADO Y REVOCADO CON YESO SOBRE MURO DE ADOBE
2	PICADO Y REVOCADO CON YESO	10	PICADO Y REVOCADO CON YESO SOBRE MURO DE ADOBE	19	PINTURA LATEX INTERIOR
3	PINTURA LATEX INTERIOR	11	PINTURA LATEX INTERIOR	20	RETIRO Y COLOC. PUERTA DE MADERA ROBLE INCLUYE MARCO, PINTURA Y QUINCALLERIA
4	PINTADO REJILLA DE PROTECCION DE VENTANAS	12	PROV. E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE	21	PROV. Y COLOC. VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO
5	PINTADO AL ACEITE DE PUERTAS	13	PINTADO REJILLA DE PROTECCION	22	PINTURA LATEX EXTERIOR
6	PINTADO AL ACEITE MARCOS DE VENTANAS	14	PINTADO AL ACEITE DE PUERTAS	23	REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO
7	RETIRO Y COLOCADO DE VIDRO DOBLE 4MM	15	PINTADO AL ACEITE MARCOS DE MADERA (VENTANAS)	24	PROV. E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE
8	PINTADO SOBRE MURO (VIÑETADO S/DISEÑO)	16	RETIRO Y COLOCADO DE VIDRO DOBLE 4MM	25	PICADO Y REPOSICION DE PISO ENLUCIDO DE CEMENTO
		17	PINTADO SOBRE MURO (VIÑETADO S/DISEÑO)	26	PINTADO DE REJILLAS
				27	PINTURA AL OLEO SOBRE MURO
				28	PINTADO SOBRE MURO (VIÑETADO S/DISEÑO)
				29	REJILLA DE PISO PARA DESAGUE

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS SEGÚN REQUERIMIENTO LAS CUALES FUERON KINDER ANTOFAGASTA, NEMECIO A. MARISCAL, EDUARDO AVARO, U.E. COLLPA BAJA.



PROYECTO:
CONST. MURO PERIMETRAL U.E. EDUARDO AVAROA

APERTURA

21 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL COMO EL ENMALLADO DE LA U.E DONDE COMPRENDE TUBOS DE 2" DE FG, TRAVESAÑOS DE 1 ½", MALLA OLIMPICA DE 5X5 CM, DADOS DE HORMIGON CICLOPEO DE 0.5*0.8 CM, PUERTA DE INGRESO DE 3 MTS Y UNA DE 1 M.



**PROYECTO:
CONSTRUCCION AULAS UNIDAD EDUCATIVA ARANI**

APERTURA

21 0003 000

MONTO PRESUPUESTO UPRE	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
1.663.500,59	929.015,56	734.485,03	100.00%	55.85%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO CONSTRUCCION AULAS U.E. ARANI CORRESPONDE AL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS CON LAS AREAS REQUERIDAS QUE COMPRENDE (**Planta Baja** talleres, sala de música, gabinete de maestros, dirección general, auditorio, baños y 5 aulas, en la **primera planta** están las 7 aulas , 2 salas de computación, sala de lectura con su biblioteca). EL CAUL ESTA SIENDO EJECUTADO DE ACUERDO A LOS ITEMS SEGÚN CONTRATO, ESPECIFICACIONES TENCICAS Y PLANOS CONSTRUCTIVOS.



Plazo de Ejecución : 285
Fecha de Conclusión: 13/03/2017

PROYECTO:
CONST. CANCHA MÚLTIPLE VILLA BARRIENTOS

APERTURA

22 0001 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO HASTA LA FECHA NO FUE EJECUTADO, LOS RECURSOS DEL PROYECTO FUERON CONSENSUADOS ENTRE LOS BENEFICIARIOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE.

PROYECTO:
CONST. CAMPO DEPORTIVO POCOATA ALTA (E.T.P.)

APERTURA

22 0002 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	0.00%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR FALTA DE AREA DE EMPLAZAMIENTO EN LA COMUNIDAD, ACTUALMENTE SE TIENE CONSENSUADO EL EMPLAZAMIENTO PARA SU ELABORACION.

**PROYECTO:
CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO TAMBILLO LINDE**

APERTURA

22 0003 000

MONTO PRESUPUESTO UPRE	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
1.495.124,93	1.400.397,41	94.727,52	100.00%	96.66%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO TAMBILLO LINDE, CORRESPONDE AL PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE, QUE COMPRENDE LA EJECUCION DE UNA CANCHA DE CESPED SINTETICO.





GRACIAS POR SU ATENCIÓN
