

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ARANI

**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANF. PROYECTOS Y OBRAS
PUBLICAS**



INFORME GESTION 2019



GESTION
SRA. DUNIA ROJAS MAMANI

ACTIVIDAD: CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS DISTRITOS 4 Y 5

APERTURA 11 C360120600000 000	MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
				FISICO	FINANCIERO
	1.223.064,08	529.446,40	693.617,68	43,29%	43,29%

OBSERVACIONES:

SON PROYECTOS DE CONTINUIDAD CON LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LA ACTIVIDAD: CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS DISTRITOS 4 Y 5, Y SU RESPECTIVA PLANTA DE TRATAMIENTO, EL CUAL SE ESTA EJECUTANDO SEGÚN CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIO.



**ACTIVIDAD:
CONST. CANALES DE RIEGO D-1**

APERTURA
12
13360006200000 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
1.896.012,93	1.300.067,06	595.945,87	80,00%	68,57%

OBSERVACIONES:

SE ESTA PROCEDIENDO CON LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LA ACTIVIDAD: CON LA CONST. DE CANALES DE RIEGO D – 1, EL CUAL SE ESTA EJECUTANDO SEGÚN CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



**ACTIVIDAD:
FUNCIONAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO**

APERTURA
16 0 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
240.000,00	234.216,40	5.783,60	100%	97,59%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CON LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MATENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARA LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO , SEGÚN REQUERIMIENTO O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS. COMO (PANTALLAS DE TUBO FLOURESCENTES 1X40, PANTALLAS DE SODIO DE 150 WHATS, REACTANCIAS, FOTOCELULAS, CABLE BI POLAR, ALAMBRE DE AMARRE, CINTA AISLANTE Y OTROS).



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

APERTURA
16 0 002

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
80.000,00	75.665,00	4.335,00	100%	94,58%

OBSERVACIONES:

RECURSOS DESTINADOS PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, LAS CUALES ESTAN SUJETOS A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y AMPLIACIONES SEGÚN REQUERIMIENTO.



ACTIVIDAD: AMPLIACION DE LINEA PILOTO CHAUPI RANCHO

APERTURA
16 0 003

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
8.800,00	8.798,50	1,50	100,00%	99,98%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CON LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA COMUNIDAD DE CHAUPI RANCHO, SEGÚN REQUERIMIENTO O SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS. COMO (CABLE DE ALUMINIO N° 6, RAT DE UNA VIA COMPLETO, GRAMPAS BI METALICA, ESTRIBO N° 4, PANTALLAS DE TUBO FLOURESCENTES 1X40) Y CAJA DE CONTROL PÁRA ALUMBRADO PUBLICO COMPLETA (CONTACTOR/DISYUNTOR / CABLES / FOTOCELULA/BASE)



PROYECTO:
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION

APERTURA
17 0 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTA RIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
60.400,00	40.768,00	19.632,00	100%	67,50%

OBSERVACIONES:

RECURSO DESTINADO PARA EL PAGO DE CONSULTORES EN LINEA QUE SON DE APOYO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y OTRAS DIRECCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

**ACTIVIDAD:
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL**

APERTURA
17 0 002

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARI O [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
50.000,00	48.210,06	1.789,94	100%	96,42%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LA ACTIVIDAD: CON EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL MURO LADO NORTE DE LA U.E. (ARANI) EL CUAL FUE EJECUTADO SEGÚN CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



**PROYECTO:
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
VECINALES**

APERTURA 18 0 001	MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
				FISICO	FINANCIERO
	180.000,00	140.878,54	39.121,46	100%	78,27%

OBSERVACIONES:

RECURSO DESTINADO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL EQUIPO PESADO, SALARIOS DE CONSULTORES EN LINEA (CHOFERES VOLQUETA I, II, MOTONIVELADORA, PALACARGADORA)



**ACTIVIDAD:
MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.**

APERTURA
18 0 002

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
90.000,00	90.000,00	0,00	100%	100%

OBSERVACIONES:

LA ACTIVIDAD FUE EJECUTADO EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO ARENA, GRAVA , PIEDRA, CLAVOS, COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (CAPELLANIA) Y PAGO DE COMBUSTIBLE DEL EQUIPO PESADO



ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE CAMINO LINDE CHICO – LINDE GRANDE

APERTURA
18 0 003

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
17.600,00	15.220,10	2.379,90	100%	86,48%

OBSERVACIONES:

LA ACTIVIDAD SE VIENE EJECUTANDO CON LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE ARANI Y EL RECURSO DESTINADO A LA COMUNIDAD SE UTILIZA EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO EN BENEFICIO DE LAS DOS COMUNIDADES.



ACTIVIDAD: AMPLIACION DE CAMINO SAGA SAGA - CURUBAMBA

APERTURA
18 0 004

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
26.667,00	26.560,83	106,17	100,00%	99.60%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD EN ATENCION A LA SOLICITUD DEL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS CON EL ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA PARA LA APERTURA DE CAMINO EN SECTOR DE SAGA SAGA - CURUBAMBA EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



ACTIVIDAD:
MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO PLAZA – CEMENTERIO
POCOATA

APERTURA
18 0 005

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
17.777,00	17.775,93	1,07	100,00%	99.99%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD EN ATENCION A LA SOLICITUD DEL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS CON EL ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO Y ENSANCHE DE CAMINO EN SECTOR TRAMO PLAZA – CEMENTERIO POCOATA EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



ACTIVIDAD: AMPLIACION DE CAMINO BALCONES

APERTURA
18 0 006

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
8.889,00	8.889,00	0,00	100%	100%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD EN ATENCION A LA SOLICITUD DEL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS CON EL ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO Y ENSANCHE DE CAMINO EN SECTOR PUENTE DEL CAMINO BALCONES EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



PROYECTO: CONST. DE ATAJADO DISTRITO 2



APERTURA

12 13360006500000 000

MONTO PRESUPUESTO (FDI)	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
25.000,00	25.000,00	0,00	100,00%	100,00%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO (E.D.T.P.) DEL PROYECTO EN ATENCION A LA SOLICITUD DEL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS CON LA ELABORACION DEL PROYECTO: CONST. DE ATAJADO DISTRITO 2 EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS EL MISMO TENDRÁ UN COSTO TOTAL DE Bs. 1.291.353,10 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

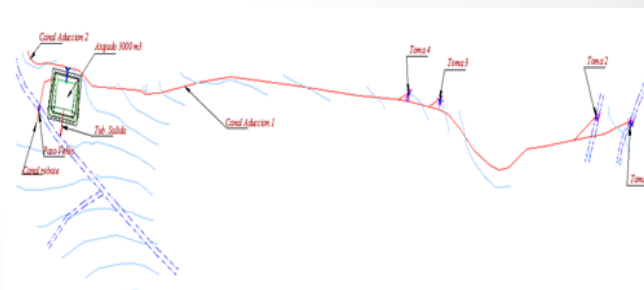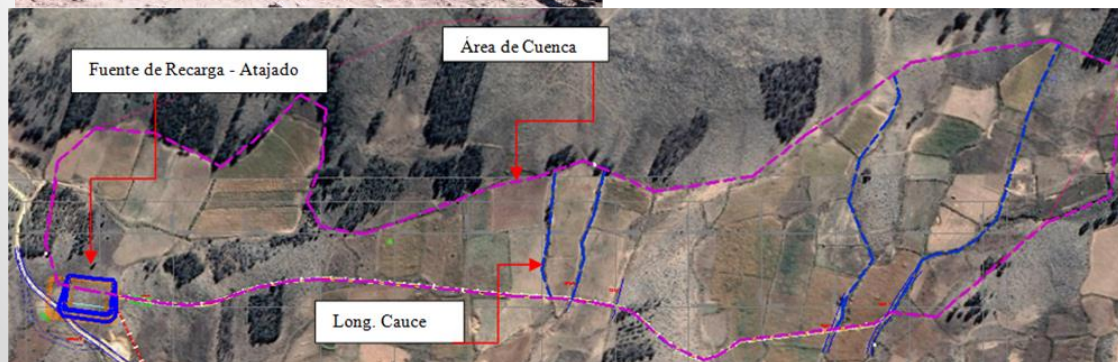

PROYECTO: **CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLES DISTRITO 3**

APERTURA

18 13360006600000 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUEST ARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
225.415,00	218.426,14	6.988,86	100%	96,90%

OBSERVACIONES:

EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO CALLES DISTRITO 3 (AV. GUALBERTO VILLARROEL) EN PROCESO PARA SU EJECUCION.



PROYECTO: CONST. ASFALTO FLEXIBLE ARANI - COLLPA CIACO

APERTURA

18 13360006700000 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
50.000,00	49.500,00	500,00	100,00%	99%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO (E.D.T.P.) DEL PROYECTO EN ATENCION A LA SOLICITUD DEL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS CON LA ELABORACION DEL PROYECTO: CONST. ASFALTO FLEXIBLE ARANI - COLLPA CIACO EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS, EL MISMO TENDRÁ UN COSTO TOTAL DE Bs., 13.187.160,07 PARA LA ETAPA INVERSION DEL PROYECTO.



FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

Nombre:	Conexión Asfalto Flexible Arani - Collpa Ciaco
Ubicación Política:	Municipio de Arani, Primera Sección Provincia Arani, Departamento de Cochabamba.
Ubicación Geográfica:	Latitud Sud: 17° 35' 32,82" Longitud Oeste: 65° 46' 18,70" Altitud: 2.765 m.s.n.m.
Comunidades beneficiadas:	Collpa, Colca, Cuen, Chailpa Ocho, Pachapaya y Sivingasi. Distrito 5 Collpa Ciaco
Grupo Meta:	408 familias beneficiarias y 1872 habitantes. Hombres=801 y Mujeres=981.
Longitud total Vía:	5-250 Km. (3.250 metros lineales de vía)
Objetivos del Proyecto:	Es el de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores beneficiados con el proyecto de Asfalto Flexible Arani - Collpa Ciaco, representados por las comunidades como son: Collpa, Colca, Collpa, Chailpa Ocho, Pachapaya y Sivingasi, que se conecten mediante una vía, mejorada de forma significativa la vialidad con otras poblaciones y de acceso viable durante todo el año en condiciones óptimas de transitableidad.
Objetivo Específico:	- Integrar física, económicamente y socialmente a 1872 habitantes de 408 familias en forma directa con las distintas poblaciones, mediante el Asfalto Flexible Arani - Collpa Ciaco. - Crear de una infraestructura vial de mejor acceso permanente y seguro que cumpla con las normas de diseño de caminos del SNC, garantizando la transitableidad durante todo el año. - Ayudar a la verificación vial de manera poder integrar a los poblados del área de estudio con poblados alejados de la zona, mejorados de una vía óptima para su transitableidad.
Metas y/o Resultados:	- Se dispondrá de una vía o camino para las comunidades beneficiadas con el Asfalto Flexible con una longitud total de 5-25 Km. (3.250 Mts lineales de camino). - Construcción de una plataforma con un ancho de calzada de 7 mts. De 2 carriles con ancho de carril de 3,50 m., Carga base e=20 cm., Curbas adólicas e=7,50 cm. Pendiente superior 7%, Velocidad de diseño 40 km/h a 40 km/h. Radio mínimo: 14,0 m. (Hombros normal o peaje: 2,0% (1,0% transversal y 1,0% longitudinal).
Marco Institucional:	Gobierno Autónomo Municipal de Arani
Costo Inversión:	Bs. 12.559.290,07 \$us. 1.804.482,77
Costo Supervisión:	Bs. 627.960,00 \$us. 90.224,14
Costo Total de Proyecto:	Bs. 13.187.160,07 \$us. 1.894.706,91
Costo por Km.	Bs. 2.392.228,91 \$us. 343.711,05
Costo Inversión por familia:	Bs. 26.835,88 \$us. 3.855,73
Costo por habitante:	Bs. 6.708,95 \$us. 963,93
CAEP:	Bs. 1.740.325,52 \$us. 250.046,77 TIRP=13,76%
VANP:	Bs. 3.168.544,18 \$us. 445.250,60 RBCP = 1,25
CAES:	Bs. 1.875.348,20 \$us. 269.446,58 TIRP=14,54%
VANS:	Bs. 2.147.368,59 \$us. 308.529,97 RBC = 1,16

PROYECTO:
FUNCIONAMIENTO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

APERTURA
19 0 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
13.042,00	7.909,00	5.133,00	100%	60,64%

OBSERVACIONES:

EL RECURSO ASIGNADO ES PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MATERIALES DE ESCRITORIO, HOJAS, FOLDERS, TINTAS PARA IMPRESORA Y OTROS. Y AL MISMO TIEMPO PARA PROCEDER CON UN BUEN EQUIPAMIENTO EN LA CREACION DE UNA DIRECCION DE URBANISMO.

**PROYECTO:
CONST. PUESTO DE SALUD PUKA ORKO**

APERTURA
20 13360006800000 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
53.600,00	0,00	53.600,00	0,00%	0,00%

OBSERVACIONES:

LOS RECURSOS A LA FECHA NO FUERON EJECUTADOS POR FALTA COORDINACION DE LOS DIRIGENTES Y AL MISMO TIEMPO POR FALTA DE UN PREDIO DE EMPLAZAMEINTO DEL PROYECTO, EL CUAL SERA ENCAMINADO EN COORDINACION CON LOS RESPONSABLES Y LOS BENEFICIARIOS.

**PROYECTO:
CONST. PUESTO DE SALUD SAGA SAGA**

APERTURA	MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
				FISICO	FINANCIERO
20 13360005700000 000	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%	0,00%

OBSERVACIONES:

LOS RECURSOS A LA FECHA NO FUERON EJECUTADOS POR FALTA COORDINACION DE LOS DIRIGENTES Y AL MISMO TIEMPO POR FALTA DE UN PREDIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO, EL CUAL SERA ENCAMINADO EN COORDINACION CON LOS RESPONSABLES Y LOS BENEFICIARIOS.

PROYECTO:
CONST. PUESTO DE SALUD LINDE CHICO Y LINDE GRANDE

APERTURA	MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
				FISICO	FINANCIERO
20 13360005800000 000	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%	0,00%

OBSERVACIONES:

LOS RECURSOS A LA FECHA NO FUERON EJECUTADOS POR FALTA COORDINACION DE LOS DIRIGENTES Y AL MISMO TIEMPO POR FALTA DE UN PREDIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO, EL CUAL SERA ENCAMINADO EN COORDINACION CON LOS RESPONSABLES Y LOS BENEFICIARIOS.

PROYECTO: CONST. ENMALLADO UNIDAD EDUCATIVA COLKA

APERTURA

21 13360006900000 006

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
25.000,00	24.997,62	2,38	100,00%	99,99,%

OBSERVACIONES:

SE PROCEDIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EN ATENCION A LA SOLICITUD DEL DIRIGENTE Y LOS BENEFICIARIOS CON LA CONST. ENMALLADO UNIDAD EDUCATIVA COLKA EL CUAL FUE EJECUTADO EN COORDINACION Y CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.



ACTIVIDAD:
CONTRAPARTE CONST. REPRESA CUENCA PUCARA (E.D.T.P.)

APERTURA
32 0 001

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%

OBSERVACIONES:

LOS RECURSOS A LA FECHA NO FUERON EJECUTADOS POR FALTA COORDINACION DE LOS DIRIGENTES YA QUE A LA FECHA NO SE TIENE NINGUNA SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS, EL CUAL SERA ENCAMINADO EN COORDINACION CON LOS RESPONSABLES Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA

APERTURA
34 0 004

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
99.000,00	92.865,57	6.134,43	93,80%	93,80%

OBSERVACIONES:

- SE PROCEDIO CON COMPRA REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (mantenimiento de volqueta I, II pala cargadora) como ser: FUEL FILTER 2890600 - P502504, FUEL FILTER C/SEP. AGUA (1R0770) P550900, OIL FILTER INGENE, CAT HYDRAULIC OIL FILTER TRANSMISSION 1G8878,P573360, OIL FILTER INGENE 2698325 - P550920, FILTRO DE AIRE PRIMARIO P782104, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO P782107, ACEITE DE MOTOR CATERPILLAR GENUINO, ACEITE DE TRANSMISION SAE -30 CATERPILLAR GENUINO, UÑETA PARA ADAPTADOR (ESTANDAR), PASADOR DE UÑETA, SEGURO DE UÑETA, PERNOS LATERALES, STOPS Y PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA KIT FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO P181082 -P124047, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR (SEC. 15274-99289) PRIM. Y SEC. TIPO CARTUCHO, FILTRO PRIMARIO DIESEL TIPO CARTUCHO 1644499126, FILTRO DIESEL PRIMARIO, CARTUCHO UD16444-EP027 -97001, CAMBIO DE HIDRAULICO DE DIRECCION, ACEITE DE MOTOR Hi-Tek SAE 15W-40 CJ-4/SM - MAX-SYN® DIESEL-GASOL. CAT-DEO 15W40 FULL SINTETICO P/TECNOLOGI ACERT ECT-3 (3E-9713), ACEITE DE CORONA SAE 85W140 GEAR OIL YPFB, ACEITE DE CORONA SAE 80W90 GEAR OIL YPFB, ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE, RETEN DE CORONA NISSAN UD RELLENADO Y ORNEADO DE PISTA, CONJUNTO DE AIRE DE LA UNIDAD DE FRENO PULMON, CONJUNTO EMPAQUETADURA CORONA NISSAN UD, TORNEADO EL EJE, CAMBIO DE TENSORES 4 UNIDADES, BATERIAS 150 AMPERES Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO DE MANTTO , NISSAN UD INCLUYE CAMBIOS DE RETEN CORONA. CAMBIO DE ACEITE , CORONAS ADINADO DE VALVULAS DE LAS DOS VOLQUETAS



ACTIVIDAD:
**ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CENTRO
 DE CAPACITACION HUASA HUAYU.**

APERTURA 210015	MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
				FISICO	FINANCIERO
	8.889,00	8.863,00	26,00	100%	99,71%

OBSERVACIONES:

LA ACTIVIDAD FUE EJECUTADO EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO CEMENTO, ARENA, GRAVA, PIEDRA Y FIERRO.



**ACTIVIDAD:
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CENTRO
DE CAPACITACION POCOATA.**

APERTURA
210016

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARI O [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
8.889,00	8.889,00	0,00	100%	100,00%

OBSERVACIONES:

LA ACTIVIDAD FUE EJECUTADO EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO CEMENTO, ARENA LAVADA, GRAVA Y FIERRO.



ACTIVIDAD:
CONST. PUENTE VEHICULAR RIO POCOATA – PUKA ORKO

APERTURA
1813361220000000 00

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
885.669,16	885.656,39	12,77	100,00%	100,00%

OBSERVACIONES:

LA ACTIVIDAD FUE EJECUTADO CON LA CONST. PUENTE VEHICULAR RIO POCOATA – PUKA ORKO EL CUAL FUE EJECUTADO CON LA ENTIDAD FINANCIERA Y EL G.A.M.A.

ACTIVIDAD:
ADQUISICION DE TUBERIA EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLERA

APERTURA

120002

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTARIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
8.889,00	8.889,00	0,00	100,00%	100,00%

OBSERVACIONES:

LA ACTIVIDAD FUE EJECUTADO CON LA COMPRA DE TUBERIAS PARA LA COMUNIDAD DE CUCHILLERA

**ACTIVIDAD:
CONSTRUCCION DE RIEGO V. CARMEN ARANI D-1**

APERTURA
1202874696800000 000

MONTO PRESUPUESTO	MONTO EJECUTADO [Bs.]	SALDO PRESUPUESTA RIO [Bs.]	% DE AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
16.534,07	0,00	16.534,07	0,00%	0,00%

OBSERVACIONES:

LOS RECURSOS EXISTIAN AUN PLAZO LIMITADO, QUE POR FALTA DE UNA RESOLUCION DE AUTORIZACION DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DEL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ARANI NO SE PUDO FINANCIAR Y A LA FECHA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DADO DE BAJA POR FPS.

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**
