



CONST. CANAL DE RIEGO VILLA CARMEN ARANI (ETP) D-1

Apertura Programática:	12 0001 000
Monto Bs.:	90.000,00 (Según certi. Presu. 2017).
Monto según contrato:	87.200,00 Bs.
Monto ejecutado según contrato:	87.200,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de ejecución (Días):	45 días calendarios





ETP: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILLA CARMEN ARANI D-1	
Objetivo General:	Contribuir a la mejora de las condiciones de la calidad de vida de las familias beneficiarias de las comunidades de Villa Carmen y Gernan Tardío, mediante el mejoramiento de la infraestructura de riego, lo que permitirá incrementar la producción agrícola y consecuentemente se incrementará los ingresos económicos de estas familias.
Objetivos Específicos:	• Construir un sistema de canales de riego reversibles, con la capacidad de conducción al caudal asignado a esta comunidad en los diferentes periodos de riego. • Dotar de agua para riego de manera oportuna en la cantidad y calidad suficiente que garantice la producción de los cultivos. • Incorporar áreas nuevas de cultivo bajo riego, garantizando la producción agrícola. • Contribuir a la consolidación de un Comité de Riego comunal afiliado a la Asociación de Regantes de Puntos, facilitando los instrumentos legales que le permitan ejercer sus funciones para la operación y mantenimiento del sistema de manera óptima.
Metas/Actividades	Las características generales del sistema de riego son: Canales de Riego Comunidad Trama - 1 a). Longitud total = 2994 m. b). Material de canales = HPC* (H18) c). Longitud de canal Sección 70*60 cm = 600 m d). Longitud de canal Sección 70*70 cm = 1090 m e). Longitud de canal Sección 70*80 cm = 360 m f). Longitud de canal Sección 70*100 cm = 80 m g). Longitud de canal Sección 80*70 cm = 864 m. h). Tomas Parcelarias = 29 Pza.

ETP: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILLA CARMEN ARANI D-1	
Canales de Riego Comunidad Trama - 2	
a). Longitud total	= 1900 m.
b). Material de canales	= HPC* (H18)
c). Longitud de canal Sección 70*60 cm	= 980 m
d). Longitud de canal Sección 70*70 cm	= 700 m
e). Longitud de canal Sección 70*80 cm	= 220 m
f). Tomas Parcelarias	= 22 Pza.
g). Repartidor de caudal	= 2 Pza.
Canales de Riego Comunidad Trama - 3	
a). Longitud total	= 1277 m.
b). Material de canales	= HPC* (H18)
c). Longitud de canal Sección 70*60 cm	= 1117 m
d). Longitud de canal Sección 70*100 cm	= 160 m.
e). Tomas Parcelarias	= 38 Pza.
f). Repartidor de caudal	= 1 Pza.
Canales de Riego Comunidad Trama - 4	
a). Longitud total	= 1523 m.
b). Material de canales	= HPC* (H18)
c). Longitud de canal Sección 70*60 cm	= 300 m
d). Longitud de canal Sección 70*70 cm	= 700 m
e). Longitud de canal Sección 70*80 cm	= 503 m
f). Tomas Parcelarias	= 38 Pza.
g). Repartidor de caudal	= 1 Pza.

ETP: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILLA CARMEN ARANI D-1	
Canales de Riego Comunidad Trama - 5	
a). Longitud total	= 1140 m.
b). Material de canales	= HPC* (H18)
c). Longitud de canal Sección 70*60 cm	= 280 m
d). Longitud de canal Sección 70*70 cm	= 640 m.
e). Longitud de canal Sección 70*80 cm	= 200 m
f). Tomas Parcelarias	= 31 Pza.
g). Repartidor de caudal	= 1 Pza.
Canales de Riego Comunidad Trama - 6	
a). Longitud total	= 1132 m.
b). Material de canales	= HPC* (H18)
c). Longitud de canal Sección 70*60 cm	= 140 m
d). Longitud de canal Sección 70*70 cm	= 912 m.
e). Tomas Parcelarias	= 20 Pza.
f). Repartidor de caudal	= 3 Pza.
Puentes Vehicular Cajón HFA*	
a). Puentes canal 4 m Longitud Ancho 1.80 m	= 4 pza.
b). Puentes canal 6 m Longitud Ancho 1.80 m	= 8 pza.
c). Puentes canal 23 m Longitud Ancho 1.80 m	= 1 pza.
Marca Institucional:	Comunidad de Villa Carmen, Gernan Tardío Gobierno Municipal de Araní
Tiempo de ejecución:	8 meses
Costo total del proyecto	Bs. 5.282.577,83 USD = 758.991,07
Inversión de obras civiles	Bs. 4.919.440,22 USD = 704.816,12
Costo de mitigación ambiental	Bs. 49.194,40 USD = 7.048,16
Alt:	Bs. 157.749,77 USD = 22.468,07




CONST. SONDEO ELÉCTRICO PERFORACIÓN DE POZO DISTRITO 2


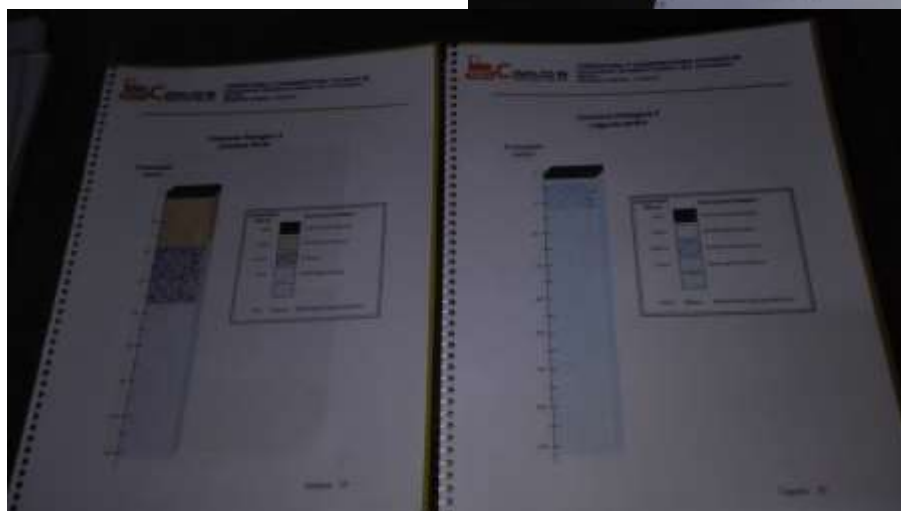





CONST. SISTEMA DE RIEGO SERRANO ALTO (ETP)

Apertura Programática:	12 0006 000
Monto Bs.:	15.000,00 (Según certi. Presu. 2017).
Monto según contrato:	15.000,00 Bs.
Monto ejecutado según contrato:	15.000,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de ejecución (Días):	15 días calendarios

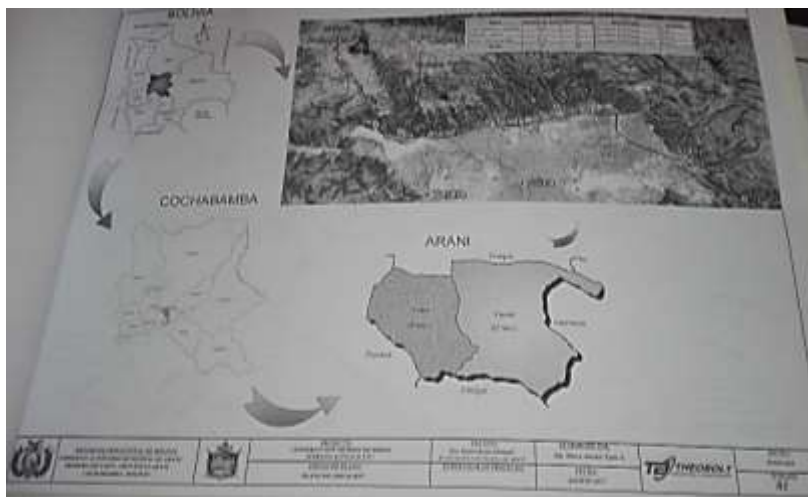

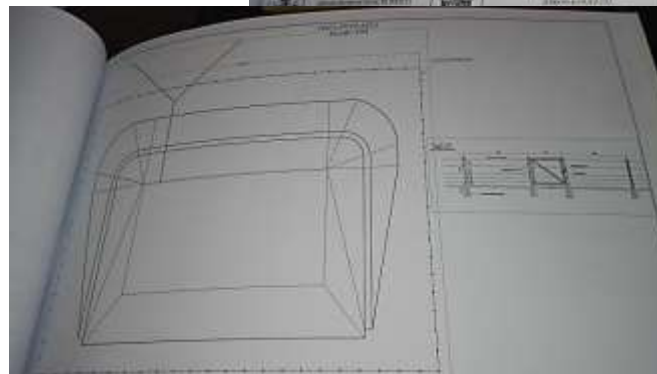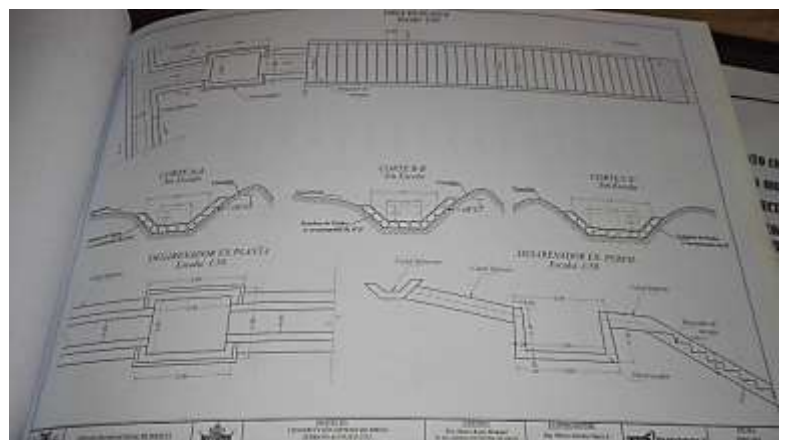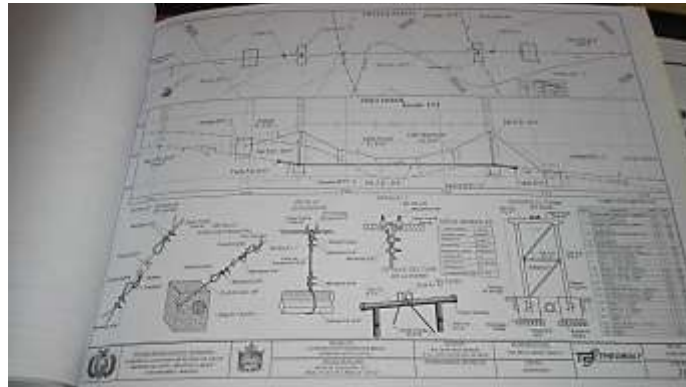



CONST. PERFORACIÓN DE POZO RIEGO ARACHACA

Apertura Programática:	12 0011 000
Monto Bs.:	50.000,00 (Según certi. Presu. 2017).
Monto según orden de servicio :	50.000,00 Bs.
Monto ejecutado según contrato:	50.000,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de ejecución (Días):	4 días calendarios





MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y FUBNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AREA URBANA - RURAL.

Apertura Programática: 16 0000 001
Fuente de Financiamiento: 41-113
Monto Bs.: 200.000,00 (Según P.O.A. 2017).
Monto según resolución 50.000,00 Bs.
Monto ejecutado según resolución Bs.: 47.980,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %: 100
Tiempo de entrega de material (Días): entrega inmediata





AMPLIACION DE LINEA PILOTO LINDE GRANDE - LINDE CHICO

Apertura Programática:	16 0000 002
Fuente de Financiamiento:	41-113
Monto Bs.:	30.000,00 (Según P.O.A. 2017).
Monto según resolución	30.000,00 Bs.
Monto ejecutado según resolución Bs.:	30.000,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100
Tiempo de entrega de material (Días):	entrega inmediata





AMPLIACION DE LINEA PILOTO PHUYU PHUYU CHICO

Apertura Programática: 16 0000 003
Fuente de Financiamiento: 41-113
Monto Bs.: 30.000,00 (Según P.O.A. 2017).
Monto según resolución 30.000,00 Bs.
Monto ejecutado según resolución Bs.: 30.000,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %: 100
Tiempo de entrega de material (Días): entrega inmediata





MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

Apertura Programática:	17 0000 001
Monto Bs.:	30.000,00 (Según certi. Presu. 2017).
Monto según orden de servicio :	30.000,00 Bs.
Monto ejecutado:	30.000,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de ejecución (Días):	10 días calendarios





CONSTRUCCIÓN MERCADO CENTRAL DE ARANI UPRE

Código sisin :	1336121930000
Monto Bs. Convenio UPRE.:	6.073.866,72 Bs.
Monto Ejecutado según contrato Bs.:	5.998.275,46 Bs.
Monto contrato Modificadorio Bs. :	6.073.235,45 Bs.
Monto ejecutado Planilla de cierre Bs. :	6.073.235,45 Bs.
Avance Financ. de la Obra %:	100%
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de Ejec. de la Obra (Días):	315 días calendarios





CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE ABAROA

Apertura Programática:	18-0006-000
Monto Bs.:	1.500.000,00 Bs. (Según certi. Presu. 2017).
Monto según contrato:	1.467.945,67 Bs.
Monto total según orden de cambio Bs.:	1.500.000,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de ejecución (Días):	90 días calendarios







CONST. TINGLADO SUB CENTRAL 12 DE ENERO

Apertura Programática:	17 0007 000
Monto Bs.:	20.000,00 (Según certi. Presu. 2017).
Monto según orden de servicio:	19.998,00 Bs.
Monto ejecutado:	19.998,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de ejecución (Días):	7 días calendarios





Gobierno Autónomo Municipal de Araní
Primera Sección Provincia Araní
Cochabamba – Bolivia
Secretaría Municipal de Obras Públicas





MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS VECINALES “mejoramiento de adoquines calles Araní”

Apertura Programática:	20 0000 000
Monto Bs.:	20.000,00 (Según certi. Presu. 2017).
Monto según orden de servicio :	19.940,00 Bs.
Monto ejecutado:	19.940,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de ejecución (Días):	9 días calendarios





CONST. PUENTES VEHICULARES MENORES D-4

Apertura Programática	: 18 0001 000
Fuente de Financiamiento	: 20-210
Monto Según Orden de compra	: 19.948,00 Bs.
Monto total ejecutado	: 19.948,00 Bs.
Avance Físico	: 100 %
Avance Financiero	: 100 %
Tiempo de ejecución	: Entrega inmediata.





APERT. CAMINOS PILA PATA – CERCO PAMPA

Apertura Programática:	18 0003 000
Fuente de Financiamiento:	44-113
Monto Bs.:	40.000,00 (Según certi. Presu. 2017).
Monto según orden de servicio	39.950,00 Bs.
Monto ejecutado según orden de servicio Bs.:	39.950,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de entrega de material (Días):	9 días calendarios





MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN POSTAS Y CENTROS DE SALUD





MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN POSTAS Y CENTROS DE SALUD

Apertura Programática	: 21 0000 005
Fuente de Financiamiento	: 41-119
Monto Según Orden de servicio	: 49.821,94 Bs.
Monto total ejecutado	: 49.821,94 Bs.
Avance Físico	: 100 %
Avance Financiero	: 100 %
Tiempo de ejecución	: 14 Días Calendario.





CONST. MURO PERIMETRAL U.E. EDUARDO AVAROA

Apertura Programática:	21 0002 000
Fuente de Financiamiento:	4.2.2.30
Monto Bs.:	40.000,00 (Según certi. Presu. 2017).
Monto según orden de servicio	39.976,21 Bs.
Monto ejecutado según orden de servicio Bs.:	39.976,21 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de entrega de material (Días):	13 días calendarios





PROYECTO: CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA ARANI UPRE

Código sisin : 1336121910000
Monto Bs. Convenio UPRE.: 3.793.313,18 Bs.
Monto Ejecutado según contrato Bs.: 3.765.344,92 Bs.
Monto contrato Modificadorio Bs. : 3.793.313,18 Bs.
Monto ejecutado Planilla de cierre a la fecha Bs. : 3.793.313,18 Bs.
Avance Físico de la Obra %: 100%
Tiempo de Ejec. de la Obra (Días): 285 días calendarios







CONST. TINGLADO U.E. JUZGADO

CUCE:	16-1336-00-712386-1-1
Monto según convenio Bs.:	281.035,00 (Según certi. Presu. 2017).
Contraparte Gobernación:	196.724,50 Bs.
Contraparte Municipal Araní	84.310,50 Bs.
Monto según contrato	275.568,48 Bs.
Monto ejecutado según orden de servicio Bs.:	275.568,48 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de ejecución (Días):	40 días calendarios





CONST. ENMALLADO COLPA BAJA

Apertura Programática:	21 0010 000
Monto Bs.:	50.000,00 (Según certi. Presu. 2017).
Monto según orden de servicio	49.998,88 Bs.
Monto ejecutado según orden de servicio Bs.:	49.998,88 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de ejecución (Días):	8 días calendarios





CONST. AULAS UNIDAD EDUCATIVA PUKA WASI (UPRE)

Monto Bs. Convenio UPRE.:	213.739,30 Bs.
Monto según contrato Bs.:	213.271,60 Bs.
Monto contrato Modificatorio Bs. :	213.739,30 Bs.
Monto ejecutado Planilla de Avance a la fecha Bs. :	42.647,29 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	20%
Tiempo de Ejec. de la Obra (Días):	80 días calendarios





CONST. AULAS UNIDAD EDUCATIVA SERRANO (UPRE)

Monto Bs. Convenio UPRE.:	2.785.385,88 Bs.
Monto según contrato Bs.:	2.783.923,61Bs.
Monto ejecutado Planilla de Avance a la fecha Bs. :	556.789,82 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	20%
Tiempo de Ejec. de la Obra (Días):	200 días calendarios







CONST. CANCHA MÚLTIPLE VILLA BARRIENTOS

Apertura Programática:	22 0001 000
Monto Bs.:	27.000,00 (Según certi. Presu. 2017).
Monto según orden de servicio	25.819,00 Bs.
Monto ejecutado según orden de servicio Bs.:	25.819,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo de entrega de material (Días):	entrega inmediata






CONST. CAMPO DEPORTIVO POCOATA ALTA (E.T.P.)

Apertura Programática:	22 0002 000
Monto Bs.:	30.000,00 (Según certi. Presu. 2017).
Monto según orden de servicio	30.000,00 Bs.
Monto ejecutado según orden de servicio Bs.:	30.000,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo del estudio (Días):	12 días calendarios





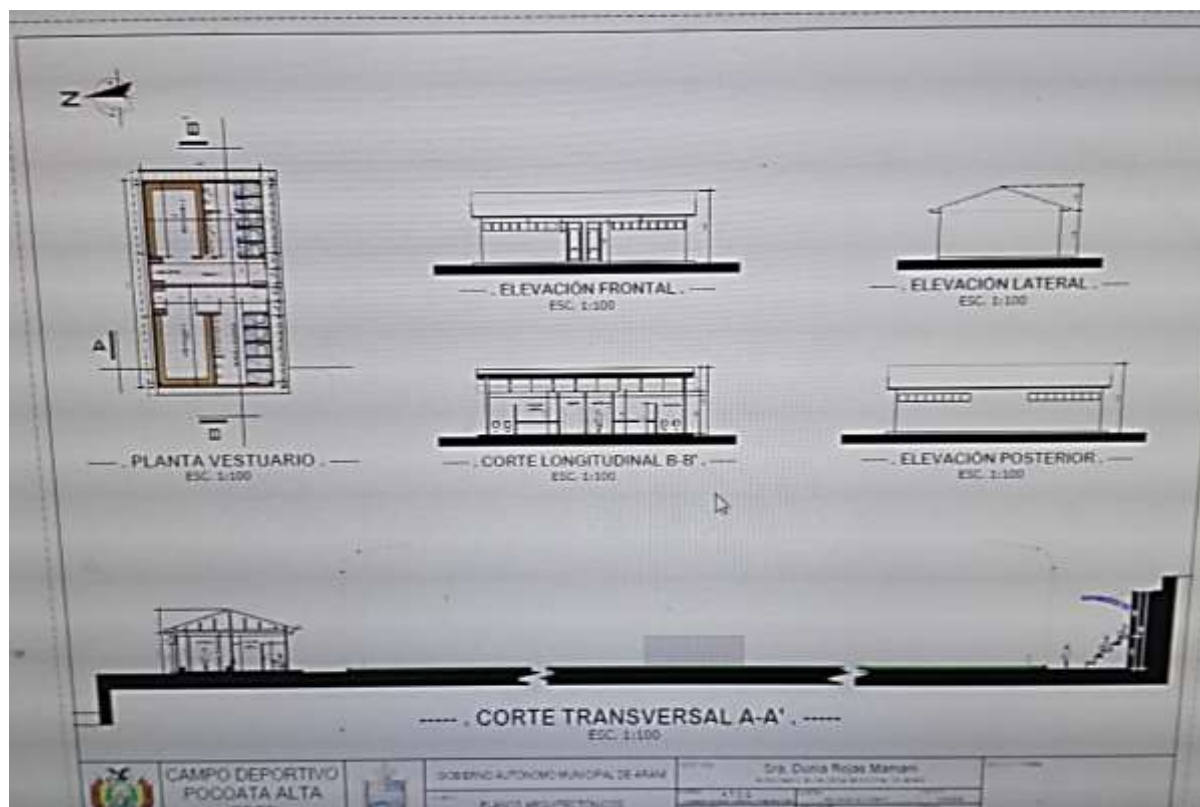

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CANCHA DE CESPED SINTETICO TAMBILLO LINDE UPRE

Código sisin : 1336012900000
Monto Bs. Convenio UPRE.: 1.868.906,16 Bs.
Monto según contrato Bs.: 1.852.890,36 Bs.
Monto ejecutado Planilla de cierre a la fecha Bs. : 1.852.890,36 Bs.
Avance Físico de la Obra %: 100%
Tiempo de Ejec. de la Obra (Días): 90 días calendarios







CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL EN LA COMUNIDAD DE VILLA EVITA

Apertura Programática:	22-0005-000
Monto Bs.:	100.000,00 (Según certi. Presu. 2016).
Monto según contrato	96.274,36 Bs.
Monto total según orden de cambio Bs.:	95.000,00 Bs.
Avance Físico de la Obra %:	100%
Tiempo del ejecución (Días):	35 días calendarios





MANTENIMIENTO, DRAGADO Y CUIDADO DE ZONAS PELIGRO







Gobierno Autónomo Municipal de Araní
Primera Sección Provincia Araní
Cochabamba – Bolivia
Secretaría Municipal de Obras Públicas

