



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI
PRIMERA SECCIÓN - PROVINCIA ARANI
COCHABAMBA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO y MEDIO AMBIENTE



**INFORME TÉCNICO
FINANCIERO**

GESTIÓN I/ 2020

RECURSOS DDEP y M A - ARANI SEGÚN POA GESTION 2020

CANTIDAD	CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	SALDO (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
1	10 0 001	FUNCIONAMIENO Y PROMOCION A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	131.960,00	49.056,95	82.903,05	37,18
2	10 0 002	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	50.000,00	7.116,00	42.884,00	14,23
3	10 0 003	IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA (ICMSMA)	20.000,00	744,00	19.256,00	3,72
4	10 0 004	PLAN NACIONAL DE EMPLEO	10.000,00	0	10.000,00	-
5	10 0 081	SEGURO AGRARIO UNIVERSAL MUNICIPIO DE ARANI	5.000,00	0,00	5.000,00	-
6	12 0 003	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE MICRORIEGO	10.000,00	0,00	10.000,00	-
7	12 0 007	ADQUISICION DE TUBERIAS PARA RIEGO VILLA CARMEN	15.000,00	0,00	15.000,00	-

RECURSOS DMDEP y M A - ARANI SEGÚN POA 2020

CANTIDAD	CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	SALDO (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
8	12 0 008	CONTRAPARTE PARA PERFORACION DE POZO PARA CINTA COCHI	30.000,00	0,00	30.000,00	-
9	12 0 009	CONTRAPARTE PARA PERFORACION DE POZO PARA RIEGO LAGUNA	30.000,00	0,00	30.000,00	-
10	12 0 010	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RIEGO VILLA FLORES	24.000,00	0,00	24.000,00	-
11	12 0 011	ADQUISICION DE TUBERIAS PARA RIEGO CUESTA PATA	24.000,00	0,00	24.000,00	-
12	12 0 012	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CAPELLANIA	24.000,00	0,00	24.000,00	-
13	12 0 013	ADQUISICION DE BOMA DE AGUA ORTEGA CHICO	10.909,00	10.690,00	219,00	97,99
14	12 0 014	ADQUISICION DE BOMBA PARA RIEGO ORTEGA GRANDE	10.909,00	10.440,00	469,00	95,70

RECURSOS DMDEP y M A - ARANI SEGÚN POA 2020

CANTIDAD	CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	SALDO (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
15	12 0 015	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA RIEGO COLLPA BAJA CHICO	10.909,00	0,00	10.909,00	-
16	12 0 016	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO ETEROVICH-CHEKEQMAYU	10.909,00	0,00	10.909,00	-
17	12 0 017	ADQUISICION DE TUBERIAS PARA RIEGO CUCHILLERA	13.333,00	0,00	13.333,00	-
18	12 0 019	TRANSFERENCIA CONST. REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO GERMAN TARDIO	200.000,00	0,00	200.000,00	-
19	12 0 020	TRANSFERENCIA CONST. REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO VILLA CARMEN	200.000,00	0,00	200.000,00	-
20	12 02874696800000 000	CONST. CANAL DE RIEGO VILLA CARMEN D-1 (ARANI)	213.580,00	0,00	213.580,00	-
21	12 02874721300000 000	CONST. SIST DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE PHUYU PHUYU CHICO (ARANI)	473.859,00	0,00	473.859,00	-

RECURSOS DMDEP y M A - ARANI SEGÚN POA 2020

CANTIDAD	CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	SALDO (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
22	12 02874723800000 000	CONST. SIST DE RIEGO TECNIFICADO CATACHILLA (ARANI)	300.816,00	95.522,63	205.293,37,00	31,75
23	1202874725000000 000	AMPL. REVESTIMIENTO CANALES DE RIEGO VILLA CARMEN (ARANI)	813.477,00	0	813.477,00	-
24	1202874726800000 000	CONST. REVESTIMIENTO DE RIEGO CANALES DE RIEGO GERMAN TARDIO	771.209,00	0	771.209,00	-
25	1213360002800000 000	CONST. 15 POZOS DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE ARANI	70.000,00	40.096,00	29.904,00	57,28
26	12133600062300000 000	CONST. CANALES DE RIEGO D-1 (ARANI)	4.000.000,00	0	4.000.000,00	-
27	13 0 001	CONSERVACIÓN DE PARQUE Y JARDINES	40.000,00	3.332,20	36.667,80	8,33
28	13 0 002	MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL VIVERO PARA FORESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANI	20.000,00	1.769,90	18.230,10	8,85

RECURSOS DMDEP y M A - ARANI SEGÚN POA 2020

CANTIDAD	CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO SEGÚN POA Bs.	EJECUCION FINANCIERA (Bs.)	SALDO (Bs.)	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
29	14 0 001	LIMPIEZA Y RECOJO DE BASURA AREA URBANA Y RURALL DEL MUNICIPIO	40.000,00	3.520,92	36.479,08	8,80
30	14 0 002	CONTRAPARTE PARA PLANTA RECICLADORA DE BASURA (MCM) VALLE ALTO	30.000,00	0	30.000,00	-
31	29 0 001	FUNCIONAMIENTO DE MATADERO MUNICIPAL	47.000,00	12.324,7	34.675,30	26,22
32	31 0 002	PREVENCION DE DESASTRES NATURALES	15.000,00	7.204,00	7.796,00	48,03
			7.665.870,00	241.817,30		
		TOTAL	3.452.290,00	241.817,30		

FUNCIONAMIENTO Y PROMOCION A LA PROD AGROP.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
10 0 001	FUNCIONAMIENTO Y PROMOCION A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	131.960,00	49.056,95	82.903,05	37,18	35	

Resultados y/o Observaciones

- Actividad que esta contemplado para la cancelación del personal de DMDEPyM.A., combustible e imprenta.

APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %	
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
10 0 002	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	50.000,00	7.116,00	42.884,00	14,23	

Resultados y/o Observaciones


- Apoyo actividades en producción agropecuaria en diferentes comunidades del Municipio, ferias productivas (incentivos), talleres de capacitación (refrigerios).
- Compra de Bomba de agua sumergible Asociación el CASTILLO (COLLPA CIACO) de 5.5 HP.



Entrega de bomba de agua a la Asociación de riego el CASTILLO'



Bomba de agua para la asociacion EL CASTILLO''

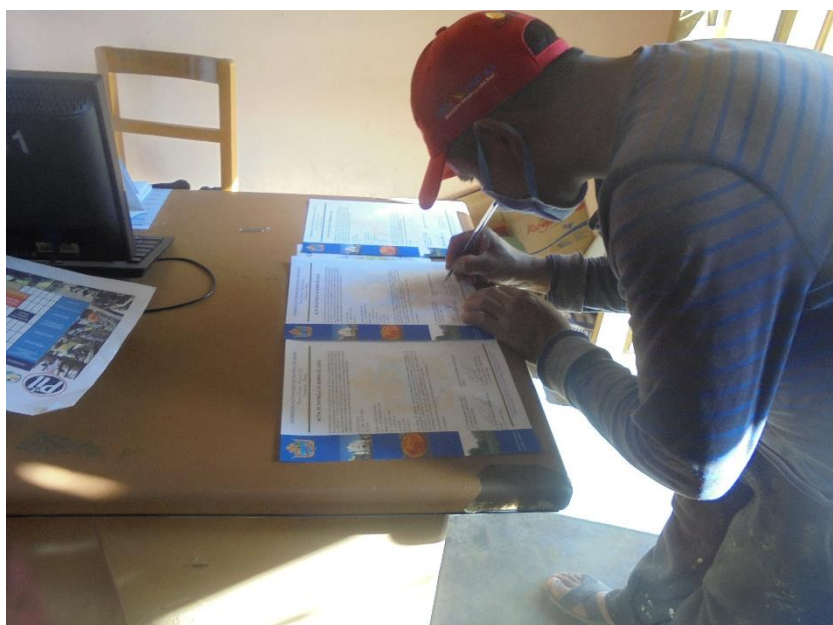

Firma de acta de recepción y de transferencia.

IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA (ICMSMA)

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
10 0 003	IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA (ICMSMA)	20.000,00	744,00	19.256,00	3,72%	4,0 %	

Resultados y/o Observaciones

- Compra de Lubricantes y repuestos para 4 tractores (Mantenimiento). Las cuales han generado 23.011,0 Bs. de los cuales se gasto en combustible 6.890,14Bs. y pago a choferes 4.359,5Bs., Ingreso a **GAMA 11.781,36Bs.** Combustible se realizo el carguío a cada tractor la suma de 555 Bs./ tanque full que dura 20 horas.

(PLAN NACIONAL DE EMPLEO)

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
10 0 004	PLAN NACIONAL DE EMPLEO	10.000,00	0	10.000,00	0,0	0,00	

Resultados y/o Observaciones

- En tramite.

SEGURO AGRARIO UNIVERSAL MUNICIPIO DE ARANI

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
10 0 081	SEGURO AGRARIO UNIVERSAL MUNICIPIO DE ARANI	5.000,00	0,00	5.000,0	0,0	0,00	

Resultados y/o Observaciones

No se realizó la transferencia del presupuestario según Convenio Intergubernativo PACHAMAMA al Instituto Agrario INSA. Porque no se inscribió ninguna hectárea para este 2020. sobre desastres naturales.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE MICRORIEGO

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 003	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE MICRORIEGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

- Esta en tramite

ADQUISICION DE TUBERIAS PARA RIEGO VILLA CARMEN

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 007	ADQUISICION DE TUBERIAS PARA RIEGO VILLA CARMEN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

Adquisición que esta en tramite

CONTRAPARTE PARA PERFORACION DE POZO CINTA COCHI

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 008	CONTRAPARTE PARA PERFORACION DE POZO PARA CINTA COCHI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

Esta a la espera de la confirmación del viceministerio de riego para dar inicio de perforación de pozos o hacer cambio de solicitud comunal.

CONTRAPARTE PARA PERFORACION DE POZO PARA RIEGO LAGUNA

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 009	CONTRAPARTE PARA PERFORACION DE POZO PARA RIEGO LAGUNA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

Esta a la espera de la confirmación del viceministerio de riego para dar inicio a la perforación de pozos o hacer cambio de solicitud comunal.

ADQUISICION DE MATERIAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RIEGO VILLA FLORES

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 010	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RIEGO VILLA FLORES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

Presupuesto que esta en tramite

ADQUISICION DE TUBERIAS PARA RIEGO CUESTA PATA

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 011	ADQUISICION DE TUBERIAS PARA RIEGO CUESTA PATA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,0%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

Presupuesto que esta en tramite.

ADQUISICON DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CAPELLANIA

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 012	ADQUISICON DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CAPELLANIA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,0%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

Presupuesto que esta en tramite.

ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA RIEGO ORTEGA CHICO

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 013	ADQUISICION DE BOMA DE AGUA ORTEGA CHICO	10.909,00	10.690,00	219,00	97,99	90%	

Resultados y/o Observaciones

Presupuesto ejecutado con la compra de una bomba de 5,5 HP.

- La comunidad esta comprando tubos de succión para luego hacer la instalación de la bomba.



ADQUISICION DE BOMBA PARA RIEGO ORTEGA GRANDE

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 014	ADQUISICION DE BOMBA PARA RIEGO ORTEGA GRANDE	10.909,00	10.440,00	469,00	95,70	95%	

Resultados y/o Observaciones

Presupuesto que fue ejecutado con la compra de una bomba de 7,5 HP, falta entrega a la comunidad.



ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA RIEGO COLLPA BAJO CHICO

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 015	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA RIEGO COLLPA BAJA CHICO	10.909,00	0,00	10.909,00	0,0%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

Presupuesto que tiene conflictos de tipo orgánico.

ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO ETEROVICH- CHEKEQMAYU

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 016	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO ETEROVICH- CHEKEQMAYU	10.909,00	0,00	10.909,00	0,0%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

Presupuesto que esta a la espera de solicitud de la comunidad.

ADQUISICION DE TUBERIAS PARA RIEGO CUCHILLERA

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 017	ADQUISICION DE TUBERIAS PARA RIEGO CUCHILLERA	13.333,00	0,00	13.333,00	0,0%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

Presupuesto en tramite .

TRANSFERENCIA CONST. REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO GERMAN TARDIO

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 019	TRANSFERENCIA CONST. REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO GERMAN TARDIO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0%	0,0%	
Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0287472680000 0 000	CONST. REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO GERMAN TARDIO (FPS)	771.209,00	0,00	771.209,0	0,0%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

- Presupuesto que tiene Informe Técnico de Traslados de recursos al FPS.
- Aun no se presentaron la EMPRESA ni el SUPERVISOR

TRANSFERENCIA CONST. REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO VILLA CARMEN

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0 020	TRANSFERENCIA CONST. REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO VILLA CARMEN	200.000,00	0,00	200.000,0	0,0%	0,0%	

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 0287472500000 0 000	CONST. REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO VILLA CARMEN (FPS)	813.477,00	0,00	813.477,0	0,0%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

- Presupuesto que tiene el informe técnico de transferencia de recursos al FPS
- Aun no llegaron la EMPRESA ni el SUPERVISOR

CONST. SIST. RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD PHUYU PHUYU CHICO (ARANI

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 02874721300000 000	CONST. SIST. RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD PHUYU PHUYU CHICO (ARANI)	473.859,00	0,00	473.859,00	0,0%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

- Presupuesto que tiene el informe técnico de transferencia de presupuesto al FPS, además que ya se inicio la obra.
- EMPRESA. San Benito
- SUPERVISOR. Ing. Rubén Camacho



Comunidad de Phuyu Phuyu´



Inauguración de la Obra´

CONST. SIST. RIEGO TECNIFICADO CATACHILLA (ARANI)

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 02874723800000 000	CONST. SIST. RIEGO TECNIFICADO CATACHILLA (ARANI)	300.816,0	95.522,63	205.293,37	31,75%	0,0%	

Resultados y/o Observaciones

- Presupuesto que tiene el Informe Técnico de transferencia de los recursos al FPS, sin embargo ya se hicieron presente la EMPRESA A OPERAR y EL SUPERVISOR.
- EMPRESA BRIZAS SRL
- SUPERVISOR. Ing. Edwin Ponce

CONST. 15 POZOS DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE ARANI.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
12 1336000280000 0 000	CONST. 15 POZOS DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE ARANI.	70.000,00	40.096,00	29.904,00	57,28	10,0%	

Resultados y/o Observaciones

- YA SE TIENE COMPRADO LOS TRICONOS
- NO SE PUEDE OPERATIVIZAR POR EL TEMA DEL COVID -19
- COMUNIDADES QUE NO QUIEREN PONER CONTRAPARTE



ADQUISICION DE TRICONO 12 ½ Y 8 1/2



CONSERVACIÓN DE PARQUE Y JARDINES

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
13 0 001	CONSERVACIÓN DE PARQUE Y JARDINES	40.000,00	3.332,20	36.667,80	8,33	80%	

Resultados y/o Observaciones


- Gastos en combustible para cisterna y otras movilidades, mantenimiento de desbrozadoras que apoyan al trabajo.



Poda de pasto



Limpieza de avenidas

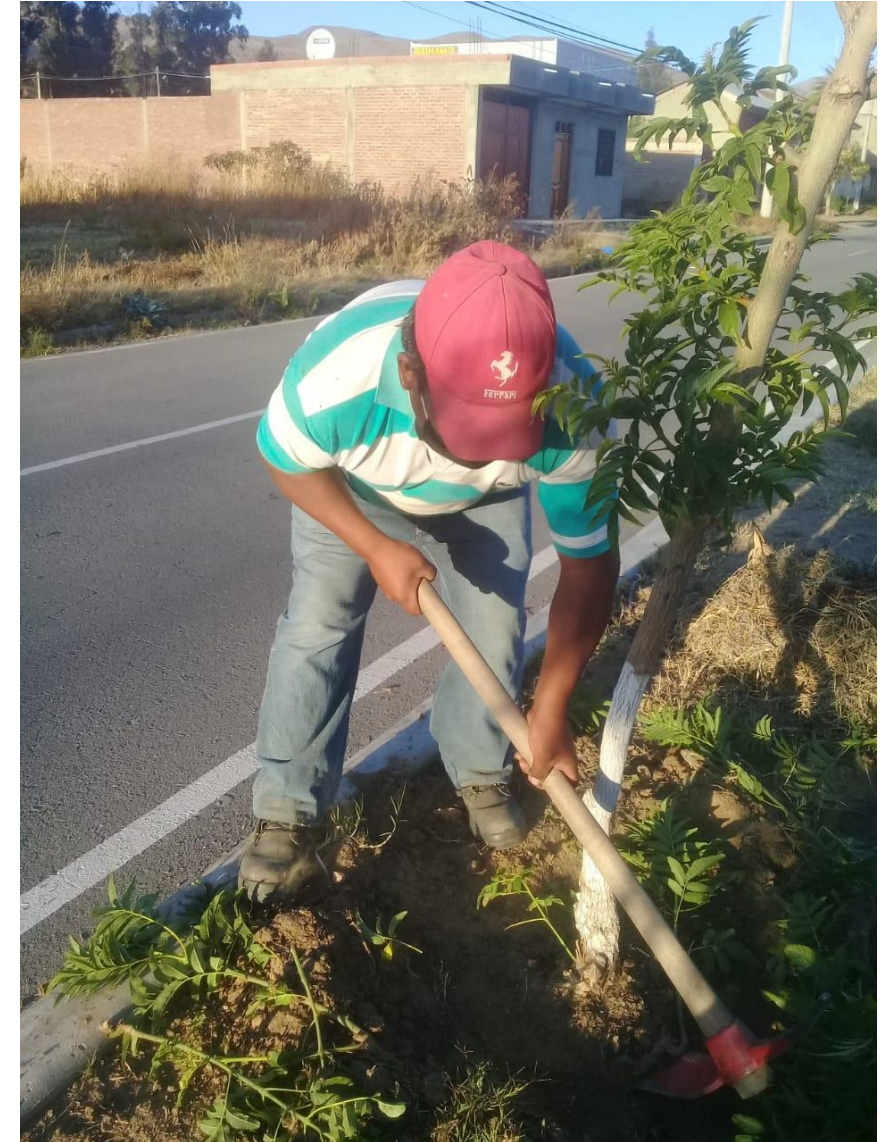

Limpieza de avenidas y calles



Limpieza de plazuelas

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL VIVERO PARA FORESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANI

Apertura programática	Nombre del proyecto y/o actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %	
		Aprobado	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
13 0 002	MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL VIVERO PARA FORESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANI	20.000,00	1.769,90	18.230,10	8,85%	50,0

Resultados y/o Observaciones

- Gastos de energía eléctrica, combustible y repuestos para maquinas segadoras,
- Pago de eventuales.
- Fertilización de durazno en huerto
- Poda de arboles duraznos y uvas establecidos en huerto



Refacción de Invernadero y de la semisombra



Preparación de sustrato



Embolsado de bolsas con sustrato



Poda de fruatles



Compra de tierra negra




Plantines en almacigo



Repique de plantines



Construcción de almacigueras

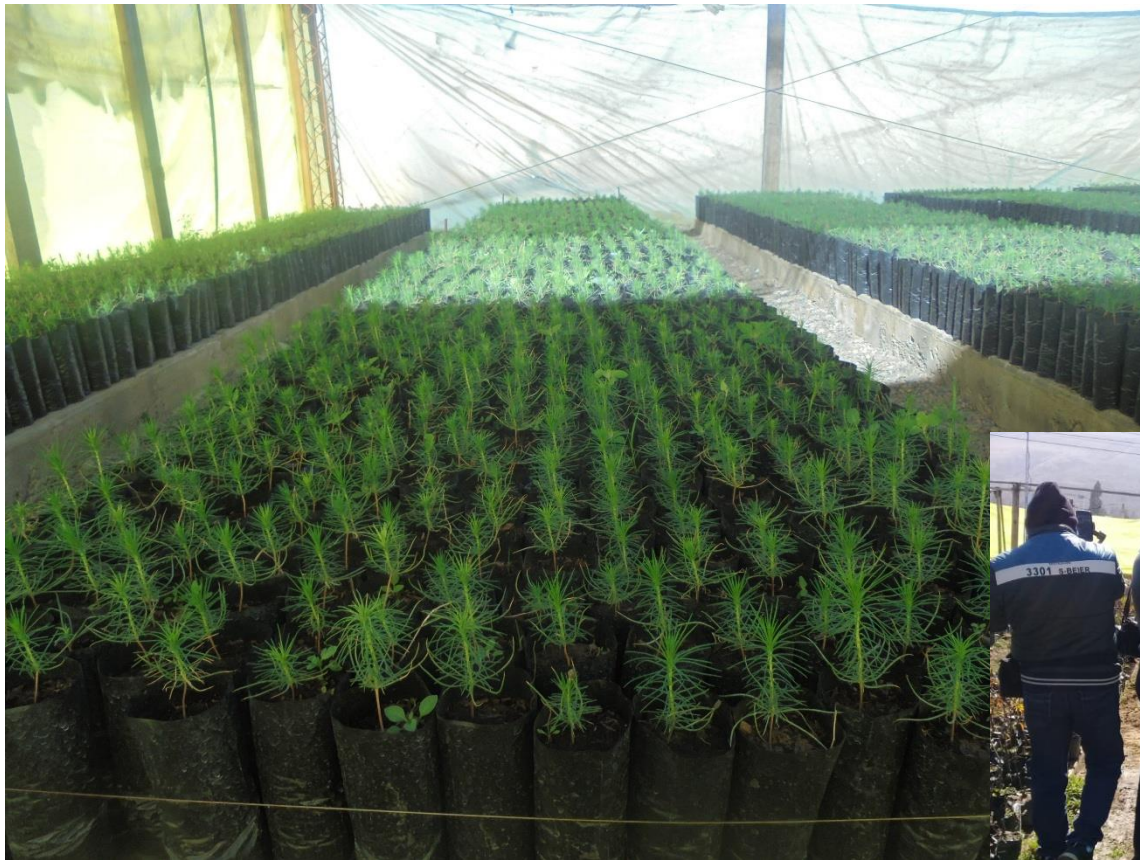

Plantines en crecimiento

Selección de estacas Sp nativas



Almacigos dañados por heladas





Siembra de papa



Producción de cebolla



Compra de luminarias



Compra de sirena

LIMPIEZA Y RECOJO DE BASURA ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO.

Apertura programática	Nombre del proyecto o Empresa	Presupuesto en Bs.			Avance %		Resultados
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico	
14 0 001	LIMPIEZA Y RECOJO DE BASURA ÁREA URBANA Y RURAL	40.000,00	3.520,92	36.479,08	8,80 %	50,0%	

Resultados y/o Observaciones

-Actividad que contempla el recojo de basura del casco viejo tres días/semana y de comunidades como;

Lunes: Plaza principal, cementerio, c/ Abaroa, aroma, Ingavi, progreso, etc.

Miércoles: Playa, UMSS, rest Rosales, puerta del vivero, Plaza principal, casona, esquina excobatientes y comunidades de Arachaca, Villa Carmen, G. tardío, Molle Molle, Tambillo Linde, Villa Evita, Juzgado y Pocoata Bajo.

Viernes: Pueblo: Plaza, torre, playa, Collpa Ciaco, Colca, Av. Paz, Puca Orko, Collpa baja

- Además que el presupuesto destinado para gastos de combustible y mantenimiento del carro basurero.



Recojo de basura en el área urbano y rural de nuestro municipio



Relleno del botadero

CONTRAPARTE PARA PLANTA RECICLADORA DE BASURA (MCM VALLE ALTO)

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %	
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
14 0 002	CONTRAPARTE PARA PLANTA RECICLADORA DE BASURA (MCM VALLE ALTO)	30.000,00	0,00	30.000,0	0,00 %	0,0%

Resultados y/o Observaciones

No se ha realizado el deposito de contraparte según convenio con la Mancomunidad de Municipios de Valle alto.

FUNCIONAMIENTO DE MATADERO MUNICIPAL

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %	
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
29 0 001	FUNCIONAMIENTO DE MATADERO MUNICIPAL	47.000,00	12.324,7	34.675,30	26,22%	50%

Resultados y/o Observaciones

- Sueldo de la profesional responsable del matadero de 12 meses.
- Durante estos seis meses se han faenado 289 cabezas de ganado bovino
- Generando un Ingreso de Bs. 2.890 Bs.



Faenado de ganado bovino



PREVENCIÓN Y DESASTRES NATURALES

Apertura programática	Nombre del proyecto o Actividad	Presupuesto en Bs.			Avance %	
		Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Económico	Físico
31 0 002	PREVENCIÓN Y DESASTRES NATURALES	15.000,00	7.204,00	7.796,00	48,03%	60,0

Resultados y/o Observaciones

- Dragado del rio Pocoata desde el sector Pocoata bajo, Ayasamana - Chekeqmayu



Dragado del rio Pocoata



Protección de comunidades y el botadero en el Pocoata



APOYO AL COVID-19



PROPUESTAS TECNICAS

PROPUESTA 1

1.1. PRODUCCIÓN Y FORESTACIÓN CON PLANTINES DEL VIVERO MUNICIPAL DE ARANI (CONCLUIDO)

PROPUESTA 2:

2.1. REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS Y AGREGADOS EN LOS RÍOS DEL MUNICIPIO DE ARANI. (FALTA INGRESO AL CONCEJO)

PROPUESTA 3:

3.1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ARANI

3.2. REGLAMENTO MUNICIPAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ARANI (FALTA INGRESAR AL CONCEJO)



GRACIAS...!!!
